

临清市龙驰轴承有限公司

年产2000万套轴承套圈项目（二期工程）

竣工环境保护验收监测报告表

（正式稿）

建设单位：临清市龙驰轴承有限公司

编制单位：临清市龙驰轴承有限公司

二〇二四年四月

建设单位：临清市龙驰轴承有限公司

法定代表人：刘天庆

编制单位：临清市龙驰轴承有限公司

法定代表人：刘天庆

建设单位：临清市龙驰轴承有限公司

电话：18265568999

传真：/

邮编：252600

地址：山东省聊城市临清市青年办事处房村厂315省道路北

目 录

表 1 基本情况	1
表 2 工程建设内容	5
表 3 主要污染源、污染物处理和排放	12
表 4 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定.....	17
表 5 验收监测质量保证及质量控制	21
表 6 验收监测内容	24
表 7 验收监测结果	27
表 8 环评批复落实情况	32
表 9 验收监测结论与建议	37
附件 1 项目地理位置图	
附件 2 建设项目厂区平面布置图	
附件 3 聊城市润森环保有限公司关于《临清市龙驰轴承有限公司年产 2000 万套轴承套圈项目环境影响报告表》中的“结论与建议”。（2021 年 12 月）	
附件 4 临清市行政审批服务局以临审环评〔2022〕07 号文关于《临清市龙驰轴承有限公司年产 2000 万套轴承套圈项目环境影响报告表》的批复（2022 年 1 月 11 日）	
附件 5 该项目验收监测期间工况情况记录表（2024 年 1 月 24 日-25 日）	
附件 6 防渗证明	
附件 7 排污许可证	
附件 8 危险废物委托处置合同	
附件 9 污染物总量确认书	
附件 10 应急预案备案表	
附件 11 夜间不生产证明	

附件 12 一期工程专家验收意见

附件 13 监测报告。

表 1 基本情况

建设项目名称	临清市龙驰轴承有限公司年产2000万套轴承套圈项目(二期工程)				
建设单位名称	临清市龙驰轴承有限公司				
建设项目性质	新建 改扩建√ 技改 迁建 (划√)				
建设地点	山东省临清市青年路街道办事处房村厂居南323省道以北临清市龙驰轴承有限公司现有厂区内				
主要产品名称	轴承套圈				
设计生产能力	年产2000万套轴承套圈				
实际生产能力	年冷轧约2250吨钢管				
建设项目环评时间	2021年12月		开工建设日期	2023年5月	
调试时间	2024年1月		验收现场监测时间	2024年1月24日-25日	
环评报告表审批部门	临清市行政审批服务局		环评报告表编制单位	聊城市润森环保有限公司	
环保设施设计单位	----		环保设施施工单位	----	
投资总概算	500 万元	环保投资总概算	20万元	比例	4%
实际总投资	200 万元	环保投资	11万元	比例	5.5%
国家法律法规	1、《中华人民共和国环境保护法》(2015.1.1); 2、《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年12月修正); 3、《中华人民共和国大气污染防治法》(2016.1.1); 4、《中华人民共和国水污染防治法》(2018.1.1); 5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年4月修订); 6、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(2018年12月修正); 7、《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》(国				

续表 1 基本情况

国家法律法 规	<p>发[2013] 37 号)；</p> <p>8、《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》(国发[2015]17 号)；</p> <p>9、《产业结构调整指导目录》(2024 年本)；</p> <p>10、《国家危险废物名录》(2021 年版)；</p> <p>11、生态环境部 2019 年第 9 号公告《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》(2018 年 5 月)；</p> <p>12、中华人民共和国国务院 第 682 号令《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》(2017 年 10 月 1 日)；</p> <p>13、《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》(国环规环评[2017]4 号)；</p> <p>14、《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》的通知(环办环评函[2020]688 号)；</p> <p>15、《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》(环办[2015]52 号)；</p> <p>16、《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》(环办环评[2018]6 号)。</p>
------------	--

续表 1 基本情况

<p>地方法律法规</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、《山东省水污染防治条例》(2018.12.1); 2、《山东省大气污染防治条例》(2016.7.22); 3、《山东省环境保护条例》(2019.01.01); 4、《山东省实施<中华人民共和国固体废物污染环境防治法>办法》(2018 年 1 月修正); 5、《山东省环境噪声污染防治条例》（2018.01.23）； 6、《关于加强建设项目环境影响评价制度和建设项目环境保护设施“三同时”管理工作的通知》(鲁政办发[2006]60号)； 7、《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（鲁环办函[2016] 141 号）； 8、《关于印发<建设项目环评审批的具体操作程序>和<建设单位竣工环境保护验收的具体操作程序>的通知》（鲁环发[2007] 147 号）； 9、《山东省环境保护厅关于进一步加强环境安全应急管理工作的通知》（鲁环发[2013] 4 号）。
---------------	---

续表 1 基本情况

<p>标准 规范、 验收 依据</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）； 2、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）； 3、《声环境质量标准》（GB3096-2008）； 4、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）； 5、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）； 6、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）； 7、《挥发性有机物排放标准第 7 部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）； 8、《大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）； 9、《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB37/990-2019）。
<p>基础 依据</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、聊城市润森环保有限公司编写的《临清市龙驰轴承有限公司年产 2000 万套轴承套圈项目环境影响报告表》； 2、临清市行政审批服务局以临审环评〔2022〕07 号文关于《临清市龙驰轴承有限公司年产 2000 万套轴承套圈项目环境影响报告表》的批复； 3、临清市龙驰轴承有限公司年产 2000 万套轴承套圈项目（一期）竣工环境保护验收组意见； 4、临清市龙驰轴承有限公司年产 2000 万套轴承套圈项目（二期工程）竣工环境保护验收监测方案。

表 2 工程建设内容

1、建设项目基本情况

项目名称：临清市龙驰轴承有限公司年产 2000 万套轴承套圈项目（二期工程）

建设单位：临清市龙驰轴承有限公司

建设性质：扩建项目（C3489 其他通用零部件制造；三十一、通用设备制造业 34，69—通用零部件制造 348 中的“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低 VOCs 含量涂料 10 吨以下的除外）”）

建设地点：山东省临清市青年路街道办事处房村厂居南 323 省道以北临清市龙驰轴承有限公司现有厂区内（东经：115°36′46.119″，北纬：36°46′22.841″）

临清市龙驰轴承有限公司年产 2000 万套轴承套圈项目（二期工程）位于山东省临清市青年路街道办事处房村厂居南 323 省道以北临清市龙驰轴承有限公司现有厂区内，该项目为扩建项目；计划总投资 500 万元，其中环保投资 20 万元；该项目分期建设，分期验收；该项目一期工程于 2022 年 6 月 20 日进行竣工环境保护验收自主验收，一期工程主要安装 7 套冷轧机组，一期工程达到年产 1200 万套轴承套圈的能力；该期项目实际总投资 200 万元，其中环保投资 11 万元。该期项目依托原有生产车间、购置冷轧机组设备，故该期项目仅验收冷轧工序，以毛坯钢管、轧制油、液压油等为原料，经冷轧等工序生产轴承套圈，该期项目建成后达到年冷轧约 2250 吨钢管的生产能力。该项目不新增员工，2 名员工由原有项目进行调剂，年工作时间为 300 天，1 班制，每班工作 8h。

2、建设项目“三同时”情况

2021 年 12 月，聊城市润森环保有限公司编写了《临清市龙驰轴承有限公司年产 2000 万套轴承套圈项目环境影响报告表》。2022 年 1 月 11

续表 2 工程建设内容

日临清市行政审批服务局以临审环评（2022）07 号文对该项目的环境影响报告表进行批复。2023 年 12 月 15 日进行了排污许可证的重新申请，（许可证编号：91371581MA3C4BB724001P，有效期限：2023-12-15 至 2028-12-14）。

该期项目于 2023 年 5 月开工建设，2024 年 1 月投入试生产。

3、验收范围及内容

（1）验收范围

本次竣工环境保护验收范围为临清市龙驰轴承有限公司年产 2000 万套轴承套圈项目（二期工程）建设内容，主要包括生产车间、办公室、公用工程、环保工程等。

该项目验收监测对象见表 2-1。

表 2-1 验收监测对象一览表

类别		验收监测（或调查）对象
污染物排放	废水	该期项目无废水产生。
	废气	该期项目冷轧工序产生的废气经“密闭集气罩+油雾净化器+过滤棉吸附+活性炭吸附设施”处理后，通过 1 根 15m 高排气筒排放。
	固废	固废、危废暂存及最终处置措施
	噪声	厂区边界噪声
环境风险		环境风险防范措施落实情况
环境管理		环境管理制度、环境监测制度的制定与落实情况

（2）验收内容

1) 对项目的实际建设内容进行检查，核实本期项目地理位置以及平面布置，核实本期项目的产品内容以及实际生产能力、项目设备的安装使用情况；

2) 检查本期项目各个单元的污染物的实际产生情况以及相应的环保设施实际配置情况和实际运行情况。该项目主要环保设施验收内容具体如下：

续表 2 工程建设内容

表 2-2 主要环保设施验收内容一览表

项目	产生环节	污染物	处理措施	验收内容	执行标准
废气	冷轧工序	VOCs、油雾	密闭集气罩+油雾净化器+过滤棉吸附+活性炭吸附设施处理后通过 15m 排气筒排放	密闭集气罩+油雾净化器+过滤棉吸附+活性炭吸附设施处理后通过 15m 排气筒排放	《挥发性有机物排放标准第 7 部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表 1 中 II 时段排放限值要求，《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB37/990-2019）表 1 中排放浓度限值要求
噪声	生产设备	连续等效 A 声级	隔声、消声、减振	隔声、消声、减振	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准
固体废物	含油废渣、废轧制油、废过滤棉、废活性炭、废润滑油、废液压油、废包装桶		收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置	收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

3) 检查环评批复的落实情况的落实情况；核查周围敏感保护目标分布及受影响情况。

(3) 验收工作过程

根据对年产 2000 万套轴承套圈项目（二期工程）竣工环境保护验收现场勘察，据此编写了现场验收监测方案。

根据该项目实际建设情况和对该项目主要污染源和污染物及其设施运转情况分析，确定本次验收监测内容为废气和噪声。

我单位根据现场验收监测方案委托山东恒辉环保科技有限公司于 2024 年 1 月 24 日、2024 年 1 月 25 日，对该项目的废气和噪声进行了监测。

根据该项目的监测数据及现场调查情况，编写了临清市龙驰轴承有限公司年产 2000 万套轴承套圈项目（二期工程）竣工环境保护验收监测报告。

续表 2 工程建设内容

4、建设内容

该期项目主要工程内容见表 2-3。

表 2-3 该项目主要工程内容

类别	环评建设内容		一期建设内容	该期实际建设内容
主体工程	1#冷轧车间	占地面积 500m ² ，安装冷轧机组，依托原有冷轧车间，新增设备	同环评	该期项目原有车间内暂未安装设备
	2#冷轧车间	占地面积 1100m ² ，安装冷轧机组；依托原有闲置车间，新增设备	实际建设 520m ²	该期项目安装 5 台冷轧机组
	机加工车间	占地面积 800m ² ，安装切管机、车床	未建设	该期项目切管机和车床暂未安装
储运工程	物料暂存区	位于冷轧车间内部，用于原料、产品等物料暂存	同环评	同环评
辅助工程	办公室	建筑面积 100m ² ，用于职工办公，依托原有	同环评	同环评
公用工程	供水	项目用水由供水管网供给，依托原有	同环评	同环评
	供电	由供电所供给，依托原有	同环评	同环评
环保工程	废气	1#冷轧车间废气经油雾净化器+过滤棉+活性炭吸附装置（TA001）处理后通过 15m 高排气筒（DA004）排放；2#冷轧车间废气经油雾净化器+过滤棉+活性炭吸附装置（TA002）处理后通过 15m 高排气筒（DA005）排放；	同环评	新建 2#冷轧车间废气经油雾净化器+过滤棉+活性炭吸附装置处理后通过 15m 高排气筒排放
	废水	采用雨污分流的排水原则，该期项目无废水产生	同环评	同环评
	固废	危废暂存间一座，占地面积 30m ² ，用于含油废渣、废润滑油等危废的暂存	同环评	同环评，依托原有
	噪声	通过设备合理布局、基础减震、厂房隔音、距离衰减、风机采用吸声材料进行围挡降低噪声值。	同环评	同环评，依托原有

5、项目主要设备

该期项目主要生产设备表见表 2-4。

表 2-4 该期项目主要生产设备表

序号	设备名称	型号	环评数量	一期数量	该期实际数量	备注
1	冷轧机组	0.1875t/h	2	2	0	1#冷轧车间，未安装
2	冷轧机组	0.1875t/h	10	5	5	2#冷轧车间
3	切管机	JM-80	10	0	0	机加工车间

续表 2 工程建设内容

4	车床	9210	20	0	0	
---	----	------	----	---	---	--

6、主要原辅材料及能耗

该项目原辅材料和产品表见表 2-5 和表 2-6。

表 2-5 该项目主要原辅材料一览表

序号	名称	单位	环评数量	一期数量	该期项目数量	备注
1	毛坯钢管	t/a	5400	3240	2250	外购
2	轧制油	t/a	2.7	1.62	1.1	外购, 170kg/桶
3	液压油	t/a	0.24	0.144	0.1	外购, 170kg/桶

表 2-6 该项目产品规模一览表

序号	产品类型	单位	环评数量	一期数量	该期实际数量	备注
1	轴承套圈	万套/a	2000	1200	/	/
2	冷轧后钢管	t/a	/	0	2250	该期项目仅进行冷轧, 切割和车床设备暂未安装


7、地理位置及平面布置

该项目位于临清市青年路街道办事处房村厂居南 323 省道以北、临清市龙驰轴承有限公司厂区内, 项目将现有闲置车间扩建后作为冷轧 2#车间, 同时新建一座机加工车间进行生产。

出入口位于东南方向, 厂区内建筑物布置分为东西两侧, 西侧由南向北依次为宿舍、新建机加工车间、1#清洗车间, 2#冷轧车间; 东侧由南向北依次为 1#磨床车间、仓库、1#冷轧车间、办公室、2#清洗车间、2#磨床车间。车间内功能分区明确, 平面布置比较合理。地理位置图见附件 1, 项目平面布置见附件 2。

8、该项目工艺流程简介及产污环节

续表 2 工程建设内容

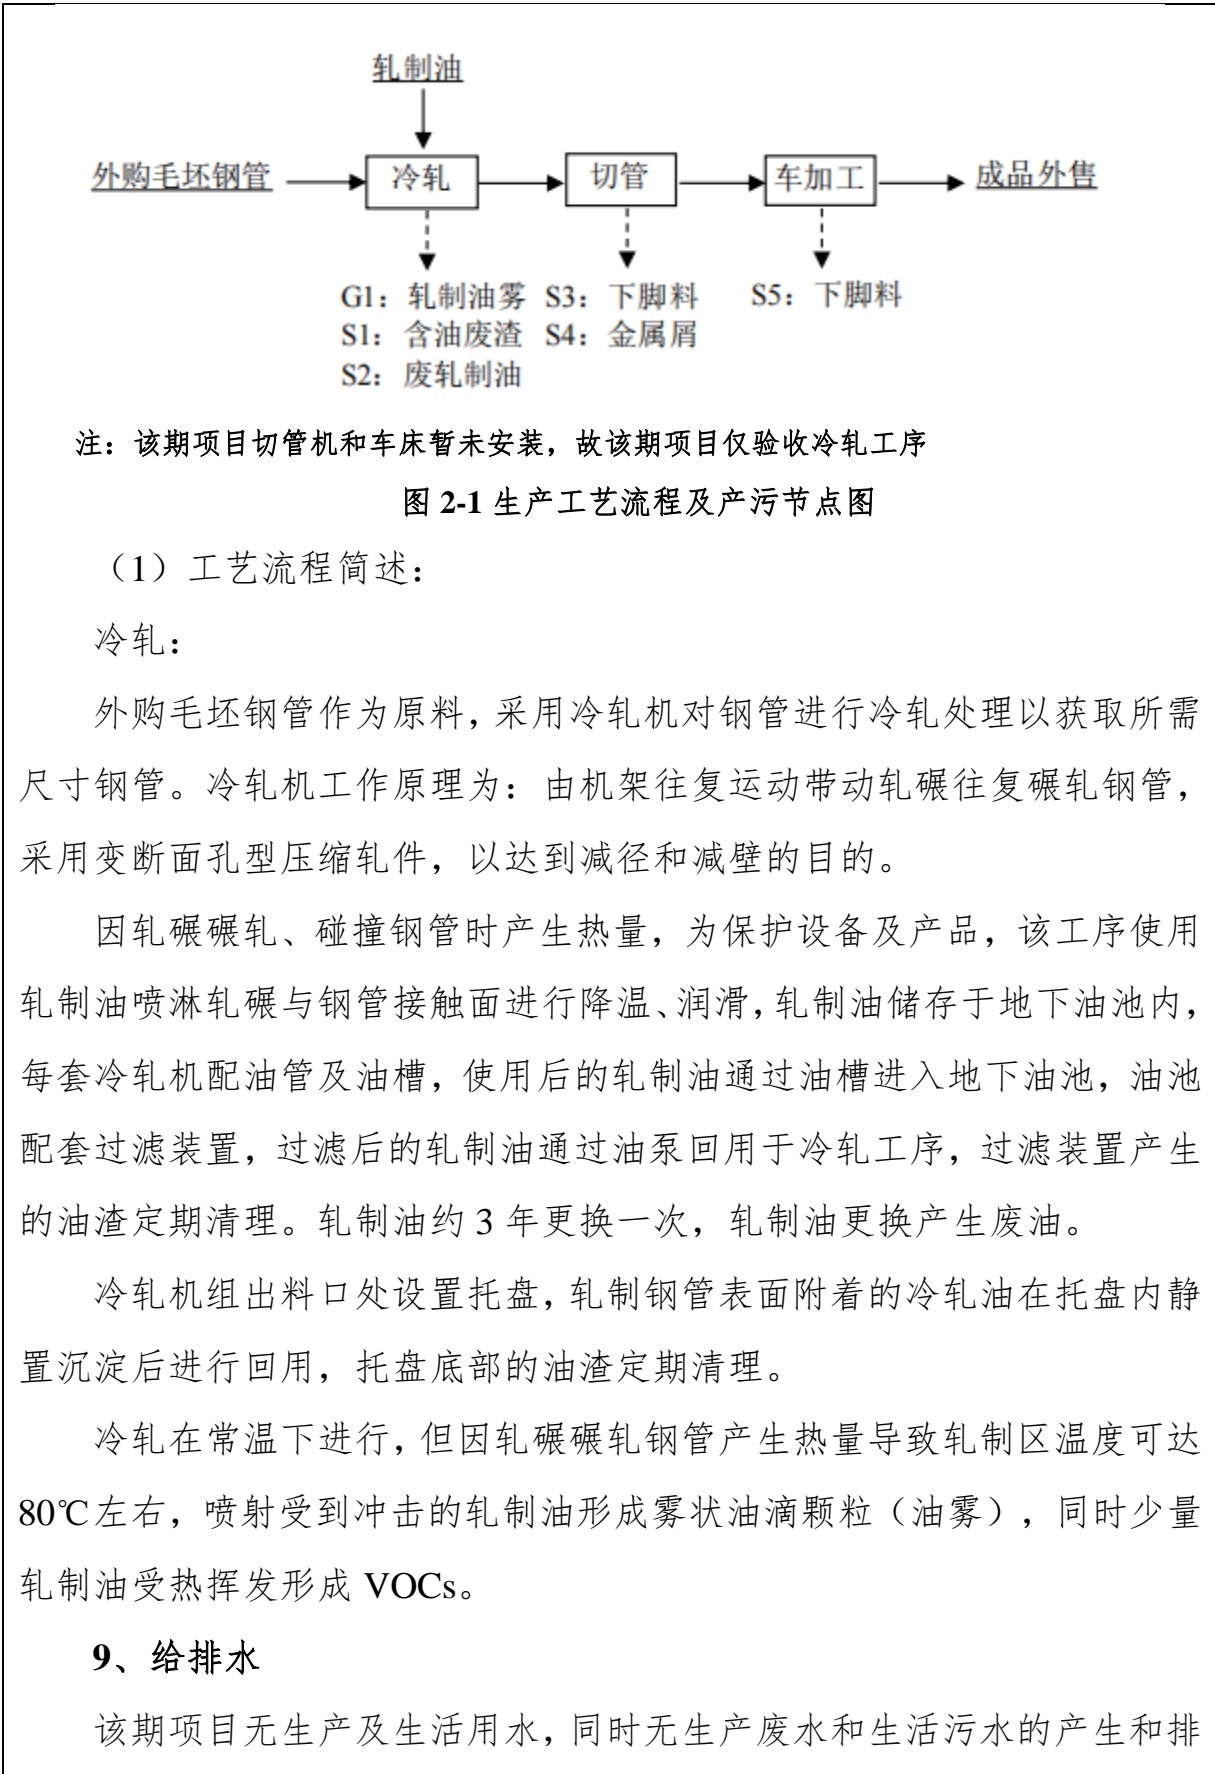

续表 2 工程建设内容

放。

10、供电

该项目用电主要为生产设备用电等，由当地电网提供，项目用电量约 65 万 kWh/a。

11、职工人数、工作制度

该项目不新增员工，员工由原有项目进行调剂 2 名员工，年工作时间为 300 天，实行常白班，每班工作 8h。

12、项目变动情况

该项目实际建设与环评阶段相比，变动如下：

- (1) 该项目分期建设，分期验收，未上设备为下期建设主要内容；
- (2) 该期项目为增加冷轧工序产生的废气处理效果，由环评中要求的“2#冷轧车间 10 套冷轧机组废气经“密闭集气罩+油雾净化器+过滤棉吸附+活性炭吸附设施”处理后，通过 1 根 15 米高排气筒排放(DA005)”，变更为“2#冷轧车间一期 5 套冷轧机组经“密闭集气罩+油雾净化器+过滤棉吸附+活性炭吸附设施”处理后，通过 1 根 15 米高排气筒排放(DA005)，2#冷轧车间二期 5 套冷轧机组经“密闭集气罩+油雾净化器+过滤棉吸附+活性炭吸附设施”处理后，通过 1 根 15 米高排气筒排放(DA005 排放)”；该期项目新增一套“油雾净化器+过滤棉吸附+活性炭吸附设施”和废气排气筒，该变动属于新增环保设施，以增加对有机废气的处理效果，同时新增废气排放口属于一般排放口，故该变动不属于重大变动。

根据生态环境部办公厅文件环办环评函[2020]688 号关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知等文件有关要求，该项目的建设地点、性质、生产工艺、生产规模均未发生重大变动，满足竣工环境环保验收工作要求。

表 3 主要污染源、污染物处理和排放

一、污染物治理/处置设施

1、废水

该期项目无废水产生。

2、废气

该期项目冷轧工序产生的废气经“密闭集气罩+油雾净化器+过滤棉吸附+活性炭吸附设施”处理后，通过 1 根 15m 高排气筒排放；未收集的废气无组织排放。

本项目废气处理设施现状图如下：



图 3-1 现场废气处理设施

续表 3 主要污染源、污染物处理和排放**3、噪声**

该项目噪声源主要来自冷轧机组、风机等产生的噪声。该项目所有设备均安装在车间内，优先选用噪声设备，均采取基础减振，经减振、隔声、距离衰减降低噪声对环境的影响。

4、固体废物

该期项目运营期固废主要为：冷轧设备自带轧制油过滤系统及出料口轧制油回收托盘底部清渣产生的含油废渣，轧制油定期更换产生的废轧制油，环保设施维护产生的废过滤棉、废活性炭，生产设施维护产生的废润滑油、废液压油，原料使用产生的废包装桶。

(1) 含油废渣

该期项目含油废渣产生量约 0.45t/a，含油废渣属于 HW08 类危险废物，行业来源为非特定行业，废物代码为 900-204-08，属于“使用轧制油进行金属轧制产生的废矿物油”，由建设单位按照规定收集暂存后，定期委托有相应处置资质的单位转运处置。

(2) 废轧制油

该期项目产生的废轧制油约为 0.27t/a，废轧制油属于 HW08 类危险废物，行业来源为非特定行业，废物代码为 900-204-08，属于“使用轧制油进行金属轧制产生的废矿物油”。由建设单位按照相关规定暂存于危废储存间，并委托有相关危废处置资质的单位定期转运处置。

(3) 废过滤棉、废活性炭

废过滤棉：该期项目废过滤棉产生量约为 0.03t/a；废过滤棉属于 HW49 类其他废物，行业来源为非特定行业，废物代码为 900-041-49，属于“含有或沾染毒性、感染性危险废物的过滤吸附介质”，危险特性为 T。由建设单位按照规定收集暂存后，定期委托有相应处置资质的单位转运处置。

续表 3 主要污染源、污染物处理和排放

废活性炭：该期项目废活性炭产生量约为 0.25t/a；废活性炭属于 HW49 类其他废物，行业来源为非特定行业，废物代码为 900-039-49，属于“VOCs 治理过程产生的废活性炭”，危险特性为 T。由建设单位按照规定收集暂存后，定期委托有相应处置资质的单位转运处置。

（4）废润滑油

废润滑油：该项目设备维护产生废润滑油，产生量约 0.01t/a，废润滑油为液态物质，其主要成分和有害成分均为矿物油，废润滑油属于危险废物。废润滑油属于 HW08 废矿物油与含矿物油废物，行业来源为非特定行业，废物代码为 900-217-08，属于“使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油”，危险特性为 T，I。由建设单位按照规定收集暂存后，定期委托有相应处置资质的单位转运处置。

（5）废包装桶

该项目废包装桶包括括废轧制油桶、废润滑油桶、废液压油桶。

其中括废轧制油桶、废润滑油桶、废液压油桶产生总量约 0.05t/a，其属于固态物质，废包装桶属于危险废物；属于 HW49 类其他废物，行业来源为非特定行业，废物代码为 900-041-49，属于“含有或沾染毒性、感染性危险废物的过滤吸附介质”，危险特性为 T。由建设单位按照规定收集暂存后，定期委托有相应处置资质的单位转运处置。

（6）废液压油

废液压油：该项目冷轧机采用液压油做为动力油，产生量约 0.08t/a，废润滑油为液态物质，其主要成分和有害成分均为矿物油，废液压油属于属于 HW08 废矿物油与含矿物油废物，行业来源为非特定行业，废物代码为 900-218-08，属于“液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油”，危险特性为 T，I。由建设单位按照规定收集暂存后，定期委托有相应处置

续表 3 主要污染源、污染物处理和排放

资质的单位转运处置。



图 3-2 危废暂存间现状图

二、其他环境保护设施

1、环境风险防范设施

为保证厂区设施的正常安全运转，企业成立突发事件应急处理小组。该项目配备了灭火器等环境风险防范设施。同时企业编制突发环境事件应急预案（备案编号：371581-2022-022-L）。

2、规范化排污口、监测设施及在线监测装置

该项目无在线监测装置，已规范化设置废气排放口。

3、环保设施投资及“三同时”落实情况

该项目计划总投资 500 万元，环保设施投资约 20 万元；实际总投资 200 万元，环保设施投资约 11 万元。该项目各项环保设施实际投资情况

续表 3 主要污染源、污染物处理和排放

见表 3-1。

表 3-1 各项环保设施实际投资情况一览表

项目	名称	投资（万元）
噪声	设备基础减震、隔声、消声	2.0
废水	/	/
废气	集气罩、活性炭吸附、排气筒等	8.0
固废	危废暂存间建设及一般固废暂存区建设	0.5
其他	防渗等	0.5
合计	11 万元	

该项目环保设施建设情况见表 3-2。

表 3-2 环保设施建设情况一览表

类别	设施名称	数量（套）	主要治理项目	运行情况
废气治理设施	密闭集气罩+油雾净化器+过滤棉吸附+活性炭吸附设施	1	VOCs、油雾	良好
噪声处理设施	减振、隔声、吸声	-----	噪声	良好
固废处理设施	危废暂存间	-----	危险废物	良好
	一般固废暂存间	-----	一般固废	良好

表 4 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

一、建设项目环评报告表的结论

从环境保护角度，本项目建设环境影响可行。

二、审批部门审批决定

临清市龙驰轴承有限公司：

你单位提出的《临清市龙驰轴承有限公司年产 2000 万套轴承套圈项目环境影响报告表》行政许可申请，经审查研究，批复如下：

一、该项目位于临清市青年街道办事处房村厂居南 323 省道以北临清市龙驰轴承有限公司现有厂区内，总投资 500 万元，其中环保投资 20 万元。该项目为扩建项目，依托现有生产车间，拟购置冷轧机组、切管机、车床等设备，以毛坯钢管、轧制油、液压油等为主要原辅材料，经冷轧、切管、车加工等工序生产轴承套圈，设计生产能力为年产轴承套圈 2000 万套。该项目已取得山东省建设项目备案证明，项目代码：2111-371581-89-01-255624。

根据环境影响报告表评价结论，在全面落实报告表及审批意见提出的各项生态环境保护措施后，能够满足主体工程的需要和环境保护的要求。

二、在项目设计、建设和环境管理中，必须严格落实建设项目环境影响报告表提出的各项要求，并着重做好以下环保工作：

1、加强施工期环境管理。严格按照环评报告表要求，采取覆盖、围挡、洒水、路面硬化、绿化等有效措施，防止扬尘污染；施工废水经沉淀后循环利用，生活污水经化粪池处理后委托环卫部门定期清运，不得外排；采取选用低噪声施工机械、合理安排施工时间、加强施工现场管理等措施，防止噪声扰民；固体废弃物须定点堆放，建筑垃圾、生活垃圾及时清运处理，不得随意倾倒。工程竣工后，施工单位应拆除各种临时

施工设施，做到“工完、料尽、场地清”。

2、加强废气污染防治。1#、2#冷轧车间冷轧工序产生的废气分别经两套“密闭集气罩+油雾净化器+过滤棉吸附+活性炭吸附设施”处理后，通过 2 根 15 米高排气筒排放（1#冷轧车间废气通过现有排放口 DA004 排放，2#冷轧车间废气通过新建排放口 DA005 排放），废气中油雾排放应满足《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB37/990-2019)表 I 中排放浓度限值要求，VOCs 排放应满足《挥发性有机物排放标准第 7 部分：其他行业》(DB37/2801.7-2019)表 1 中黑色金属冶炼和压延加工业 II 时段排放限值要求。

应加强车间管理与通风，按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)等要求做好无组织废气控制，使厂界 VOCs 排放满足《挥发性有机物排放标准第 7 部分：其他行业》(DB37/2801.7-2019)表 2 中厂界监控点浓度限值要求及《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表 A.1 厂区内无组织排放限值要求。

3、加强废水污染防治。根据报告表评价结论，拟建项目无废水产生。

4、加强噪声污染防治。夜间不得生产。选用低噪声设备并设置于车间内，再经过基础减振、隔声、距离衰减等降噪措施，使厂界噪声满足《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)2 类标准要求。

5、加强固体废物的污染防治。含油废渣、废轧制油、废过滤棉、废活性炭、废润滑油、废液压油、废包装桶为危险废物，应委托有相应资质的单位进行处置，并按照《危险废物规范化管理指标体系》的相关要求，加强危险废物收集、贮存、转移管理，确保危险废物规范化处置；危废暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单中的要求建设。一般固体废物应严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的要求进行管理；金属屑、下

脚料外售综合利用。你单位须确保所有固体废物均得到妥善处置并执行转移联单制度，对本环评未识别出的危险废物，须按危险废物管理

规定进行管理，防止对环境造成二次污染。

6、加强地下水、土壤污染防治。一般固废暂存区等一般防渗区及危废暂存间、油料暂存区、冷轧区等重点区域须采取防渗、防腐、防流失及防扬散措施，防止污染土壤、地下水和大气环境。

7、加强环境风险防范。要求认真落实报告表提出的各项风险防范措施，物料暂存区设置围堰，制定环境风险应急预案，加强生产管理，严防环境风险事故发生。

8、根据报告表结论及污染物总量确认书，该项目不占用 COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物相关总量指标。该项目 VOCs 排放量为 0.03t/a，2 倍替代量为 0.06t/a。你单位需确保污染物达标排放。

三、你单位必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。项目竣工后，须开展建设项目竣工环境保护验收，验收合格方可正式投入生产。你单位应按规定申领排污许可证，严格履行持证排污、按证排污责任。

四、积极开展清洁生产工作,严格落实“清洁生产”的相关要求。

五、加强环境监管，健全环境管理制度。按照相关规定及报告表要求设置规范的污染物排放口和固体废物堆存场，并设立标志牌。落实报告表提出的环境管理及监测计划，配备相应监测仪器或委托有资质的单位代为开展监测，建立环境监测制度。

六、环境影响评价文件自批准之日起，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或者一项以上发生重大变动且可能导致环境影响显著变化（特别是不利影响加重）的，应当重新报批环境影响评价文件。

七、你单位需认真落实各项环境污染防治措施，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

临清市行政审批服务局

2022 年 1 月 11 日

表 5 验收监测质量保证及质量控制

1、监测分析及监测仪器

项目监测分析方法如表 5-1 所示。

表 5-1 检测项目依据及分析方法

检测项目	标准名称及依据	仪器名称及型号	仪器编号	检出限
噪声	GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准	AWA6228+ 多功能声级计	HHYQ-355-2022	/
总悬浮颗粒物	HJ1263-2022 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法	AUW120D 十万分之一电子天平	HHYQ-022-2018	168 μg/m ³
		DRK 250 恒温恒湿箱	HHYQ-043-2018	7 μg/m ³
VOCs	HJ 604-2017 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法	GC-7960plus 气相色谱仪	HHYQ-297-2021	0.07mg/m ³
VOCs	HJ 38-2017 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法	GC-7960plus 气相色谱仪	HHYQ-297-2021	0.07mg/m ³
油雾	HJ 1077-2019 固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法	JC-01L-8 红外分光测油仪	HHYQ-090-2019	/

表 5-2 检测仪器一览表

设备编号	仪器名称	型号	检/校日期
HHYQ-354-2022	综合大气采样器	KB-6120-AD	2023.6.7
HHYQ-356-2022	自动烟尘烟气测试仪	GH-60E	2023.6.7
HHYQ-355-2022	多功能声级计	AWA6228+	2023.3.30
HHYQ-357-2022	声校准器	AWA6021A	2023.3.30
HHYQ-364-2022	轻便三杯风向风速表	FYF-1	2023.6.7
HHYQ-365-2022	便携式数字温湿仪	FYTH-1	2023.6.7
HHYQ-366-2022	空盒气压表	DYM3	2023.6.7
HHYQ-367-2022	真空箱气袋采样器	KB-6D	/

续表 5 验收监测质量保证及质量控制

2、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

废气监测质量保证按照国家环保部（现生态环境部）《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》的规定和要求，进行全过程质量控制。

（1）有组织排放废气监测严格按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）的要求与规定进行；无组织排放废气监测严格按照《大气污染物无组织排放监测技导则》（HJ/T55-2000）进行。

（2）被测排放物的浓度在仪器测量程的有效范围即仪器量程的 30%-70% 之间。

（3）监测仪器均经过计量检定，并在有效期内。烟尘采样器及综合大气采样器在进入现场前对采样器进行校准，在测试时保证其采样流量的准确。

3、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

厂界噪声监测质量保证按照国家环保部（现生态环境部）发布的《环境监测技术规范》噪声部分和标准方法有关规定进行。

为保证监测结果准确可靠，在噪声监测过程中，严格按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的要求和建设项目竣工环境保护验收的相关技术规定执行，监测人员均持证上岗，监测过程中测量仪器均用经检定并在有效期内的声校准器校准合格后使用。

噪声仪器经过计量部门检定合格，并在有效期内。声级计测量前后要进行自校，测量前后仪器的灵敏度相差不大于 $\pm 0.5\text{dB}$ （A）。

4、质量保证和质量控制的具体要求

检测人员的素质要求，检测人员具有扎实的环境监测基础理论和专业知识；正确熟练的掌握环境监测中操作技术和质量控制程序；熟知有关环

续表 5 验收监测质量保证及质量控制

境监测管理的法规、标准和规定。检测人员全部经培训考核合格后发上岗证，持证上岗。

检测仪器管理与定期检查，为保证监测数据的准确可靠、具有追溯性，必须对所用计量分析仪器进行计量检定，经检定合格方可使用，且在有效使用期内，每半年进行期间核查有效。

现场采样前准备，采样人员按规定要求填写现场采样物品领用清单、仪器校准等准备工作。噪声测量仪器和声校准器均在检定规定的有效期限内使用；测量前后在测量的环境中用声校准器校准测量仪器，示值偏差不大于 0.5dB(A)；测量时传声器加防风罩；记录影响测量结果的噪声源；按照监测规范采样，采样方案确定的采样点及样品具有代表性与真实性。采样时的生产条件、环境条件适时记录，对采样位置进行图示，确保采样的有效性和可追溯性，且填写受控的采样操作记录。

采样设备在领用和返还时，对其性能是否满足要求进行核查或校准，并做好详细记录。

分析测试，进入实验室的样品首先核对样品流转单、容器编号、包装情况、保存条件和有效期等，符合要求的样品方可开展检测；使用经国家计量部门授权生产的有证标准物质进行量值传递；实验室内进行质控样、平行样或加标回收样品的测定等。样品按要求保存，并在规定期限内分析完毕；

报告执行三级审核制度，本项目完成后原始记录按期归档保存。质量管理体系文件的归档应满足《记录控制程序》的有关规定，检测技术文件由档案管理员统一编号。

表 6 验收监测内容

1、废气

废气监测点位设置、监测项目和监测频次见表 6-1。

表 6-1 废气监测点位设置、监测项目和监测频次


序号	监测点位		监测项目	监测频次
1	有组织	冷轧工序废气排气筒进口	VOCs、油雾	3 次/天，共监测 2 天
2		冷轧工序废气排气筒出口	VOCs、油雾	3 次/天，共监测 2 天
3	无组织	在该项目厂界布设监测点位	颗粒物、VOCs	3 次/天，共监测 2 天
4		在厂房门窗或通风口、其他开口（孔）等排放口外 1m	非甲烷总烃（1h 平均浓度值）	3 次/天，共监测 2 天

2、厂界噪声


噪声的监测点位设置、监测项目和监测频次见表 6-2。

表 6-2 噪声的监测点位设置、监测项目和监测频次

监测点位	监测项目	监测频次
厂界各布设一个监测点位。	连续等效 A 声级 Leq[dB(A)]	昼间监测 1 次，监测 2 天 (夜间不生产)

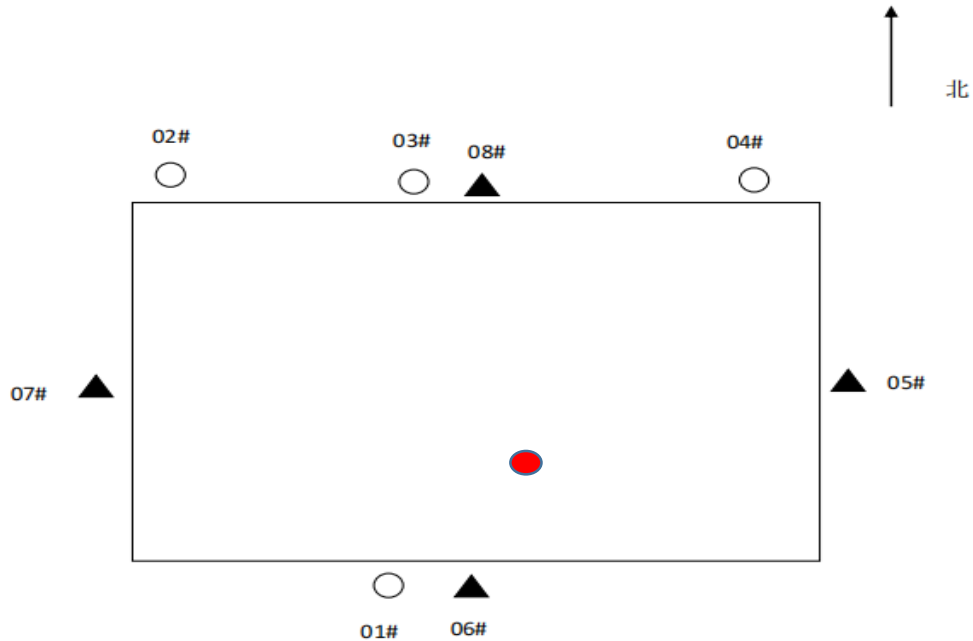

2024 年 1 月 24 日

 有组织废气排气筒

续表 6 验收监测内容



续表 6 验收监测内容

一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

（3）噪声排放标准

运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类声环境功能区标准。

表 6-3 废气排放验收执行标准一览表

污染物名称	最高允许排放浓度 (mg/m ³)	最高允许排放速率 (kg/h)	无组织最高允许排放浓度 (mg/m ³)	备注
VOCs	20	3.0	2.0	/
油雾	20	/	/	
颗粒物	/	/	1.0	

表 6-4 噪声排放验收执行标准

污染物	执行标准限值 dB(A)		执行标准
	昼间	夜间	
厂界噪声	60		《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类声环境功能区标准

表 7 验收监测结果

1、生产工况

验收监测期间项目运行负荷情况详见表 7-1。

表 7-1 该项目验收期间工况情况

验收项目 名称	临清市龙驰轴承有限公司年产 2000 万套轴承套圈项目（二期工程）					
验收监 测时间	2024 年 1 月 24 日			2024 年 1 月 25 日		
名称	实际产能	设计产 能	实际负荷 （%）	实际产能	设计产能	生产负 荷（%）
冷轧钢 管	6.82t/d	7.5t/d	90.93	7.04t/d	7.5t/d	93.87

注：监测期间产量由企业提供。

2、废气

（1）有组织废气监测结果及分析评价

该期项目冷轧工序产生的废气经“密闭集气罩+油雾净化器+过滤棉吸附+活性炭吸附设施”处理后，通过 1 根 15m 高排气筒排放。

该项目有组织废气排气筒排放监测结果见表 7-2。

续表 7 验收监测结果

表 7-2 该项目废气排气筒有组织排放废气监测结果表

监测日期	监测点位	监测项目	频次	浓度 (mg/m ³)			速率 (kg/h)			
				实测值	最大值	标准值	监测值	标杆流量 (Nm ³ /h)	最大值	标准值
2024.1.24	冷轧工序废气排气筒进口	VOCs	第 1 次	19.6	19.6	/	0.0499	2546	0.0499	/
			第 2 次	15.0			0.0363	2418		
			第 3 次	18.0			0.0453	2516		
2024.1.25			第 1 次	19.0			0.0420	2210		
			第 2 次	20.0			0.0455	2276		
			第 3 次	18.6			0.0416	2238		
2024.1.24	冷轧工序废气排气筒进口	油雾	第 1 次	7.8	8.4	/	0.0199	2546	0.0199	/
			第 2 次	7.5			0.0181	2418		
			第 3 次	6.6			0.0166	2516		
2024.1.25			第 1 次	8.0			0.0177	2210		
			第 2 次	8.4			0.0191	2276		
			第 3 次	7.2			0.0161	2238		
2024.1.24	冷轧工序废气排气筒出口	VOCs	第 1 次	1.36	1.58	2.0	0.00289	2125	0.00354	3.0
			第 2 次	1.43			0.00354	2478		
			第 3 次	1.28			0.00314	2454		
2024.1.25			第 1 次	1.54			0.00308	1998		
			第 2 次	1.58			0.00338	2140		
			第 3 次	1.39			0.00323	2322		
2024.1.24	冷轧工序废气排气筒出口	油雾	第 1 次	0.5	0.5	2.0	0.00106	2125	0.00124	/
			第 2 次	0.5			0.00124	2478		
			第 3 次	0.4			0.000982	2454		
2024.1.25			第 1 次	0.5			0.000999	1998		
			第 2 次	0.4			0.000856	2140		
			第 3 次	0.5			0.00116	2322		

注：排气筒高 H=15m，进口内径 R=0.2m，出口内径 R=0.2m。

表 7-3 环保设备对有组织挥发性有机物处理效率表

监测日期	监测项目	监测时间	处理效率 (%)
冷轧工序废气排气筒（油雾净化器+过滤棉吸附+活性炭吸附设施）			
2024.1.24	VOCs	第一次	94.21
		第二次	90.25
		第三次	93.07
2024.1.25		第一次	92.67
		第二次	92.57
		第三次	92.24
2024.1.24	油雾	第一次	94.67

续表 7 验收监测结果

2024.1.25		第二次	93.15
		第三次	94.08
		第一次	94.36
		第二次	95.52
		第三次	92.80

监测结果表明，验收监测期间冷轧排气筒出口 VOCs 排放浓度、排放速率最大值分别为 1.58mg/m³、0.00354kg/h，油雾排放浓度、排放速率最大值分别 0.5mg/m³、0.00124kg/h。排气筒环保设备（油雾净化器+过滤棉吸附+活性炭吸附设施）对 VOCs 处理效率为 90.25%~94.21%，油雾处理效率为 92.80%~95.52%。

通过监测结果可得：有组织 VOCs 排放浓度和排放速率均满足《挥发性有机物排放标准第 7 部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表 1 中“黑色金属冶炼和压延加工”II 时段排放限值要求，有组织油雾排放浓度满足《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB37/990-2019）表 1 中：轧钢-热轧精轧机（轧制机组）油雾 20mg/m³。

(2) 无组织废气监测结果及分析评价

无组织废气主要为 VOCs 和颗粒物，监测结果详见下表。

表 7-4 该项目 VOCs 无组织监测结果表

采样时间	检测项目	采样频次	检测点位及结果 (mg/m ³)				
			上风向 1#	下风向 2#	下风向 3#	下风向 4#	车间门窗户外 5#
2024.1.24	VO Cs	第一次	0.74	0.91	0.99	0.87	1.22
		第二次	0.77	1.00	0.98	0.88	1.16
		第三次	0.73	0.89	0.92	0.89	1.18
2024.1.25		第一次	0.70	0.94	0.81	0.86	1.13
		第二次	0.67	0.95	0.83	0.81	1.13
		第三次	0.73	0.93	0.88	0.91	1.15

表 7-5 该项目颗粒物无组织监测结果表

采样时间	检测项目	采样频次	检测点位及结果 (mg/m ³)			
			上风向 1#	下风向 2#	下风向 3#	下风向 4#
2024.1.	颗粒	第一次	0.221	0.263	0.273	0.276

续表 7 验收监测结果

24	物	第二次	0.228	0.279	0.292	0.287
		第三次	0.231	0.296	0.302	0.286
2024.1.25		第一次	0.231	0.273	0.279	0.284
		第二次	0.218	0.254	0.270	0.278
		第三次	0.236	0.268	0.281	0.287

监测结果表明，验收监测期间该项目厂界无组织 VOCs 排放浓度最大值为 1.0mg/m³，厂区内无组织挥发性有机物排放浓度最大值为 1.22 mg/m³，厂界无组织颗粒物排放浓度最大值为 0.302mg/m³；厂界无组织 VOCs 排放浓度满足《挥发性有机物排放标准第 7 部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表 2 厂界无组织监控点挥发性有机物浓度限值要求，厂区内无组织挥发性有机物排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准要求，无组织颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值要求。

(3) 相关参数

无组织排放废气监测期间气象参数详见表 7-6。

表 7-6 该项目监测期间气象参数监测结果

采样日期	时间	温度 (°C)	相对湿度 (%)	风向	风速 (m/s)	总云量	低云量	气压 (KPa)
2024.1.24	09:36	-2.2	50	S	1.37	1	0	103.87
	10:50	2.5	47	S	1.32	1	0	103.62
	11:55	2.9	47	S	1.30	1	0	103.58
2024.1.25	12:41	4.3	46	SE	1.29	1	0	103.32
	13:51	5.7	46	SE	1.28	1	0	103.30
	15:00	6.0	46	SE	1.27	1	0	102.28

3、厂界噪声

该项目厂界噪声监测结果见表 7-7。

表 7-7 该项目厂界噪声监测结果

监测日期	监测点位	监测时间	昼间检测结果 Leq dB (A)
2024.1.24	05#东厂界外 1m 处	10:01	54.9
	06#南厂界外 1m 处	10:14	56.8
	07#西厂界外 1m 处	10:27	56.9
	08#北厂界外 1m 处	10:38	58.1

续表 7 验收监测结果

2024.1.25	05#东厂界外 1m 处	13:03	55.9
	06#南厂界外 1m 处	13:15	57.7
	07#西厂界外 1m 处	13:28	58.1
	08#北厂界外 1m 处	13:41	52.5
2024.1.24: 无雷电, 无雨雪, 风速 1.36m/s			
2024.1.25: 无雷电, 无雨雪, 风速 1.28m/s			

监测结果表明, 验收监测期间该项目东、南、西、北厂界外 4 个监测点位的昼间等效声级最大值为 58.1dB (A), 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中 2 类声环境功能区标准。

4、污染物排放总量核算

该项目无生产废水产生, 项目不新增劳动定员, 无生活废水, 故无需总量核算。

该项目年工作时间为 300 天, 年工作 2400h。通过监测数据可知, 监测结果表明, 冷轧排气筒出口 VOCs 排放速率最大值为 0.00354kg/h, 则 VOCs 的排放量为 0.008496t/a; 根据一期工程竣工环境保护验收监测报告可知, 一期工程 VOCs 排放量为 0.0083t/a; 故该项目一期和二期工程 VOCs 排放总量合计为:0.016796t/a。满足环评及环评批复、总量确认书中总量要求 (VOCs: 0.03t/a)。

表 8 环评批复落实情况

环评批复落实情况见表 8-1。		
表 8-1 环评批复要求落实情况		
环评批复要求	落实情况	结论
<p>1、加强施工期环境管理。严格按照环评报告表要求，采取覆盖、围挡、洒水、路面硬化、绿化等有效措施，防止扬尘污染；施工废水经沉淀后循环利用，生活污水经化粪池处理后委托环卫部门定期清运，不得外排；采取选用低噪声施工机械、合理安排施工时间、加强施工现场管理等措施，防止噪声扰民；固体废弃物须定点堆放，建筑垃圾、生活垃圾及时清运处理，不得随意倾倒。工程竣工后，施工单位应拆除各种临时施工设施，做到“工完、料尽、场地清”。</p>	<p>该期项目施工期已完成，施工按要求进行施工。</p>	落实
<p>2、加强废气污染防治。1#、2#冷轧车间冷轧工序产生的废气分别经两套“密闭集气罩+油雾净化器+过滤棉吸附+活性炭吸附设施”处理后，通过 2 根 15 米高排气筒排放（1#冷轧车间废气通过现有排放口 DA004 排放，2#冷轧车间废气通过新建排放口 DA005 排放），废气中油雾排放应满足《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB37/990-2019）表 I 中排放浓度限值要求，VOCs 排放应满足《挥发性有机物排放标准第 7 部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表 1 中黑色金属冶炼和压延加工业 II 时段排放限值要求。</p> <p>应加强车间管理与通风，按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）等要求做好无组织废气控制，使厂界 VOCs 排放满足《挥发性有机物排放标准第 7 部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表 2 中厂界</p>	<p>该期项目冷轧工序产生的废气经“密闭集气罩+油雾净化器+过滤棉吸附+活性炭吸附设施”处理后，通过 1 根 15m 高排气筒排放；未收集的废气无组织排放。</p> <p>监测结果表明，验收监测期间冷轧排气筒出口 VOCs 排放浓度、排放速率最大值分别为 1.58mg/m³、0.00354kg/h，油雾排放浓度、排放速率最大值分别 0.5mg/m³、0.00124kg/h。排气筒环保设备（油雾净化器+过滤棉吸附+活性炭吸附设施）对 VOCs 处理效率为 90.25%~94.21%，油雾处理效率为 92.80%~95.52%。</p> <p>通过监测结果可得：有组织 VOCs 排放浓度和排放速率均满足《挥发性有机物排放标准第 7 部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表 1 中“黑色金属冶炼和压延加工”II 时段排放限值要求，有组织油雾排放浓度满足《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB37/990-2019）表 1 中：轧钢-热轧精轧机（轧制机组）油雾 20mg/m³。</p> <p>监测结果表明，验收监测期间该项目厂界无组织 VOCs 排放浓度最大值为 1.0mg/m³，厂区内无组织挥发性有机物排放</p>	落实

<p>监控点浓度限值要求及《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表 A.1 厂区内无组织排放限值要求。</p>	<p>浓度最大值为 1.22 mg/m³，厂界无组织颗粒物排放浓度最大值为 0.302mg/m³；厂界无组织 VOCs 排放浓度满足《挥发性有机物排放标准第 7 部分：其他行业》(DB37/2801.7-2019)表 2 厂界无组织监控点挥发性有机物浓度限值要求，厂区内无组织挥发性有机物排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)标准要求，无组织颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放限值要求。</p>	
<p>3、加强废水污染防治。根据报告表评价结论，拟建项目无废水产生。</p>	<p>该期项目无废水产生</p>	<p>落实</p>
<p>4、加强噪声污染防治。夜间不得生产。选用低噪声设备并设置于车间内，再经过基础减振、隔声、距离衰减等降噪措施，使厂界噪声满足《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)2 类标准要求。</p>	<p>该项目噪声源主要来自冷轧机组、风机等产生的噪声。该项目所有设备均安装在车间内，优先选用噪声设备，均采取基础减振，经减振、隔声、距离衰减降低噪声对环境的影响。 监测结果表明，验收监测期间该项目东、南、西、北厂界外 4 个监测点位的昼间等效声级最大值为 58.1dB (A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 2 类声环境功能区标准。</p>	<p>落实</p>
<p>5、加强固体废物的污染防治。含油废渣、废轧制油、废过滤棉、废活性炭、废润滑油、废液压油、废包装桶为危险废物，应委托有相应资质的单位进行处置，并按照《危险废物规范化管理指标体系》的相关要求，加强危险废物收集、贮存、转移管理，确保危险废物规范化处置；危废暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单中的要求建设。一般固体废物应严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的要求进行管理；金属屑、下脚料外售综合利用。你单位须确保所有固体废物均得到妥善处置并执行转移联单制度，对本环评未识别出的危险废物，须按危险废物管理规</p>	<p>该期项目运营期固废主要为：冷轧设备自带轧制油过滤系统及出料口轧制油回收托盘底部清渣产生的含油废渣，轧制油定期更换产生的废轧制油，环保设施维护产生的废过滤棉、废活性炭，生产设施维护产生的废润滑油、废液压油，原料使用产生的废包装桶。 (1) 含油废渣 该期项目含油废渣产生量约 0.45t/a，含油废渣属于 HW08 类危险废物，行业来源为非特定行业，废物代码为 900-204-08，属于“使用轧制油进行金属轧制产生的废矿物油”，由建设单位按照规定收集暂存后，定期委托有相应处置资质的单位转运处置。 (2) 废轧制油 该期项目产生的废轧制油约为 0.27t/a，废轧制油属于 HW08 类危险废物，行业来源为非特定行业，废物代码为 900-204-08，属于“使用轧制油进行金属轧制产生的废矿</p>	<p>落实</p>

<p>定进行管理，防止对环境造成二次污染。</p>	<p>物油”。由建设单位按照相关规定暂存于危废储存间，并委托有相关危废处置资质的单位定期转运处置。</p> <p>（3）废过滤棉、废活性炭</p> <p>废过滤棉：该期项目废过滤棉产生量约为 0.03t/a；废过滤棉属于 HW49 类其他废物，行业来源为非特定行业，废物代码为 900-041-49，属于“含有或沾染毒性、感染性危险废物的过滤吸附介质”，危险特性为 T。由建设单位按照规定收集暂存后，定期委托有相应处置资质的单位转运处置。</p> <p>废活性炭：该期项目废活性炭产生量约为 0.25t/a；废活性炭属于 HW49 类其他废物，行业来源为非特定行业，废物代码为 900-039-49，属于“VOCs 治理过程产生的废活性炭”，危险特性为 T。由建设单位按照规定收集暂存后，定期委托有相应处置资质的单位转运处置。</p> <p>（4）废润滑油</p> <p>废润滑油：该项目设备维护产生废润滑油，产生量约 0.01t/a，废润滑油为液态物质，其主要成分和有害成分均为矿物油，废润滑油属于危险废物。废润滑油属于 HW08 废矿物油与含矿物油废物，行业来源为非特定行业，废物代码为 900-217-08，属于“使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油”，危险特性为 T，I。由建设单位按照规定收集暂存后，定期委托有相应处置资质的单位转运处置。</p> <p>（5）废包装桶</p> <p>该项目废包装桶包括括废轧制油桶、废润滑油桶、废液压油桶。</p> <p>其中括废轧制油桶、废润滑油桶、废液压油桶产生总量约 0.05t/a，其属于固态物质，废包装桶属于危险废物；属于 HW49 类其他废物，行业来源为非特定行业，废物代码为 900-041-49，属于“含有或沾染毒性、感染性危险废物的过滤吸附介质”，危险特性为 T。由建设单位按照规定收集暂存后，定期委托有相应处置资质的单位转运处置。</p> <p>（6）废液压油</p> <p>废液压油：该项目冷轧机采用液压油做为动力油，产生量约 0.08t/a，废润滑油为液态物质，其主要成分和有害成分均为矿物</p>
---------------------------	--

	油，废液压油属于属于 HW08 废矿物油与含矿物油废物，行业来源为非特定行业，废物代码为 900-218-08，属于“液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油”，危险特性为 T，I。由建设单位按照规定收集暂存后，定期委托有相应处置资质的单位转运处置。	
6、加强地下水、土壤污染防治。一般固废暂存区等一般防渗区及危废暂存间、油料暂存区、冷轧区等重点区域须采取防渗、防腐、防流失及防扬散措施，防止污染土壤、地下水和大气环境。	该期项目按要求对一般固废暂存区等一般防渗区及危废暂存间、油料暂存区、冷轧区等重点区域采取防渗、防腐、防流失及防扬散措施，防止污染土壤、地下水和大气环境。	落实
7、加强环境风险防范。要求认真落实报告表提出的各项风险防范措施，物料暂存区设置围堰，制定环境风险应急预案，加强生产管理，严防环境风险事故发生。	为保证厂区设施的正常安全运转，企业成立突发事件应急处理小组。该项目配备了灭火器等环境风险防范设施。同时企业编制突发环境事件应急预案（备案编号：371581-2022-022-L）	落实
8、根据报告表结论及污染物总量确认书，该项目不占用 COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物相关总量指标。该项目 VOCs 排放量为 0.03t/a，2 倍替代量为 0.06t/a。你单位需确保污染物达标排放。	该项目无生产废水产生，项目不新增劳动定员，无生活废水，故无需总量核算。 该项目年工作时间为 300 天，年工作 2400h。通过监测数据可知，监测结果表明，冷轧排气筒出口 VOCs 排放速率最大值为 0.00354kg/h，则 VOCs 的排放量为 0.008496t/a；根据一期工程竣工环境保护验收监测报告可知，一期工程 VOCs 排放量为 0.0083t/a；故该项目一期和二期工程 VOCs 排放总量合计为：0.016796t/a。满足环评及环评批复、总量确认书中总量要求（VOCs：0.03t/a）。	落实
9、你单位必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。项目竣工后，须开展建设项目竣工环境保护验收，验收合格方可正式投入生产。你单位应按规定申领排污许可证，严格履行持证排污、按证排污责任。	2021 年 12 月，聊城市润森环保有限公司编写了《临清市龙驰轴承有限公司年产 2000 万套轴承套圈项目环境影响报告表》。2022 年 1 月 11 日临清市行政审批服务局以临审环评〔2022〕07 号文对该项目的环境影响报告表进行批复。2023 年 12 月 15 日进行了排污许可证的重新申请，（许可证编号：91371581MA3C4BB724001P，有效期限：2023-12-15 至 2028-12-14）。该期项目于 2023 年 5 月开工建设，2024 年 1 月投入试生产。满足“三同时”制度要求。	落实
10、加强环境监管，健全环境管理制度。按照相关规定及报告表要求设置规范的污染物排放口和	按照相关要求制度环境管理知道、危险废物管理制度等，废气排放口设置废气监测口和监测平台，悬挂标示牌。同时按照要求	落实

<p>固体废物堆存场，并设立标志牌。落实报告表提出的环境管理及监测计划，配备相应监测仪器或委托有资质的单位代为开展监测，建立环境监测制度。</p>	<p>制度自行监测方案，委托第三方检测公司按照排污许可中的要求进行环境监测。</p>	
---	--	--

表 9 验收监测结论与建议

一、结论

1、“三同时”执行情况

2021 年 12 月，聊城市润森环保有限公司编写了《临清市龙驰轴承有限公司年产 2000 万套轴承套圈项目环境影响报告表》。2022 年 1 月 11 日临清市行政审批服务局以临审环评〔2022〕07 号文对该项目的环境影响报告表进行批复。2023 年 12 月 15 日进行了排污许可证的重新申请，（许可证编号：91371581MA3C4BB724001P，有效期限：2023-12-15 至 2028-12-14）。

该期项目于 2023 年 5 月开工建设，2024 年 1 月投入试生产。

2、废气监测结论

该期项目冷轧工序产生的废气经“密闭集气罩+油雾净化器+过滤棉吸附+活性炭吸附设施”处理后，通过 1 根 15m 高排气筒排放；未收集的废气无组织排放。

监测结果表明，验收监测期间冷轧排气筒出口 VOCs 排放浓度、排放速率最大值分别为 $1.58\text{mg}/\text{m}^3$ 、 $0.00354\text{kg}/\text{h}$ ，油雾排放浓度、排放速率最大值分别 $0.5\text{mg}/\text{m}^3$ 、 $0.00124\text{kg}/\text{h}$ 。排气筒环保设备（油雾净化器+过滤棉吸附+活性炭吸附设施）对 VOCs 处理效率为 90.25%~94.21%，油雾处理效率为 92.80%~95.52%。

通过监测结果可得：有组织 VOCs 排放浓度和排放速率均满足《挥发性有机物排放标准第 7 部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表 1 中“黑色金属冶炼和压延加工”II 时段排放限值要求，有组织油雾排放浓度满足《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB37/990-2019）表 1 中：轧钢-热轧精轧机（轧制机组）油雾 $20\text{mg}/\text{m}^3$ 。

监测结果表明，验收监测期间该项目厂界无组织 VOCs 排放浓度最大

续表 9 验收监测结论与建议

值为 $1.0\text{mg}/\text{m}^3$ ，厂区内无组织挥发性有机物排放浓度最大值为 $1.22\text{mg}/\text{m}^3$ ，厂界无组织颗粒物排放浓度最大值为 $0.302\text{mg}/\text{m}^3$ ；厂界无组织 VOCs 排放浓度满足《挥发性有机物排放标准第 7 部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表 2 厂界无组织监控点挥发性有机物浓度限值要求，厂区内无组织挥发性有机物排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准要求，无组织颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值要求。

3、废水结论

该期项目无废水产生。

4、噪声监测结论

该项目噪声源主要来自冷轧机组、风机等产生的噪声。该项目所有设备均安装在车间内，优先选用噪声设备，均采取基础减振，经减振、隔声、距离衰减降低噪声对环境的影响。

监测结果表明，验收监测期间该项目东、南、西、北厂界外 4 个监测点位的昼间等效声级最大值为 $58.1\text{dB}(\text{A})$ ，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类声环境功能区标准。

5、固体废弃物处置情况

该期项目运营期固废主要为：冷轧设备自带轧制油过滤系统及出料口轧制油回收托盘底部清渣产生的含油废渣，轧制油定期更换产生的废轧制油，环保设施维护产生的废过滤棉、废活性炭，生产设施维护产生的废润滑油、废液压油，原料使用产生的废包装桶。

含油废渣、废过滤棉、废活性炭、废润滑油、废包装桶、废轧制油、废液压油由建设单位按照相关规定暂存于危废储存间，并委托有相关危废

续表 9 验收监测结论与建议

处置资质的单位定期转运处置。

通过采取以上措施，项目固废均得到妥善处置，因此，固体废物对环境的影响很小。

6、验收总结论

综上所述，临清市龙驰轴承有限公司年产2000万套轴承套圈项目（二期工程）在施工和试运营阶段采取的生态保护措施和污染防治措施有效可行。从环保角度看，建设单位认真执行了相关的环保制度，基本落实了环境影响报告表中提出的各项环保措施。本报告认为，该项目符合建设项目竣工环境保护验收条件。

二、建议

- 1、积极配合环保部门的监督、检测等环保管理。建立健全环保机构，分工负责，加强监督，完善环境管理。
- 2、加强设备的运行管理，严格执行各工艺控制条件进行操作。
- 3、加强厂区绿化。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：临清市龙驰轴承有限公司


填表人（签字）：

项目经办人（签字）：


建设项目	项目名称	年产 2000 万套轴承套圈项目（二期工程）			项目代码	C3489 其他通用零部件制造			建设地点	山东省临清市青年路街道办事处房村厂居南 323 省道以北临清市龙驰轴承有限公司现有厂区内			
	行业类别（分类管理名录）	三十一、通用设备制造业 34，69—通用零部件制造 348 中的“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低 VOCs 含量涂料 10 吨以下的除外）”			建设性质	<input type="checkbox"/> 新建 <input checked="" type="checkbox"/> 改扩建 <input type="checkbox"/> 技术改造			项目厂区中心经度/纬度	东经：115° 36′ 46.119″，北纬：36° 46′ 22.841″			
	设计生产能力	年产 2000 万套轴承套圈			实际生产能力	年冷轧 2250 吨钢管			环评单位	聊城市润森环保有限公司			
	环评文件审批机关	临清市行政审批服务局			审批文号	临审环评（2022）07 号			环评文件类型	环境影响报告表			
	开工日期	2023 年 5 月			竣工日期	2024 年 1 月			排污许可证申领时间	2023 年 12 月 15 日			
	环保设施设计单位	-			环保设施施工单位	-			本工程排污许可证编号	91371581MA3C4BB724001P			
	验收单位				环保设施监测单位	山东恒辉环保科技有限公司			验收监测时工况	91.87%~94.7%			
	投资总概算（万元）	500			环保投资总概算（万元）	20			所占比例（%）	4			
	实际总投资	200			实际环保投资（万元）	11			所占比例（%）	5.5			
	废水治理（万元）	/	废气治理（万元）	8	噪声治理（万元）	2	固体废物治理（万元）	0.5	绿化及生态（万元）	-	其他（万元）	0.5	
新增废水处理设施能力	-			新增废气处理设施能力	-			年平均工作时	2400h				
运营单位	临清市龙驰轴承有限公司			运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）				91371581MA3C4BB724	验收时间				
污染物排放总量控制（工业建设项目填）	污染物	原有排放量(1)	本期工程实际排放浓度(2)	本期工程允许排放浓度(3)	本期工程产生量(4)	本期工程自身削减量(5)	本期工程实际排放量(6)	本期工程核定排放总量(7)	本期工程“以新带老”削减量(8)	全厂实际排放总量(9)	全厂核定排放总量(10)	区域平衡替代削减量(11)	排放增减量(12)
	废水												
	化学需氧量												
	氨氮												
	废气												
	二氧化硫												
	烟尘												
	氮氧化物												
	工业固体废物												
挥发性有机物						0.008496			0.016796				

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

附件 1 地理位置图

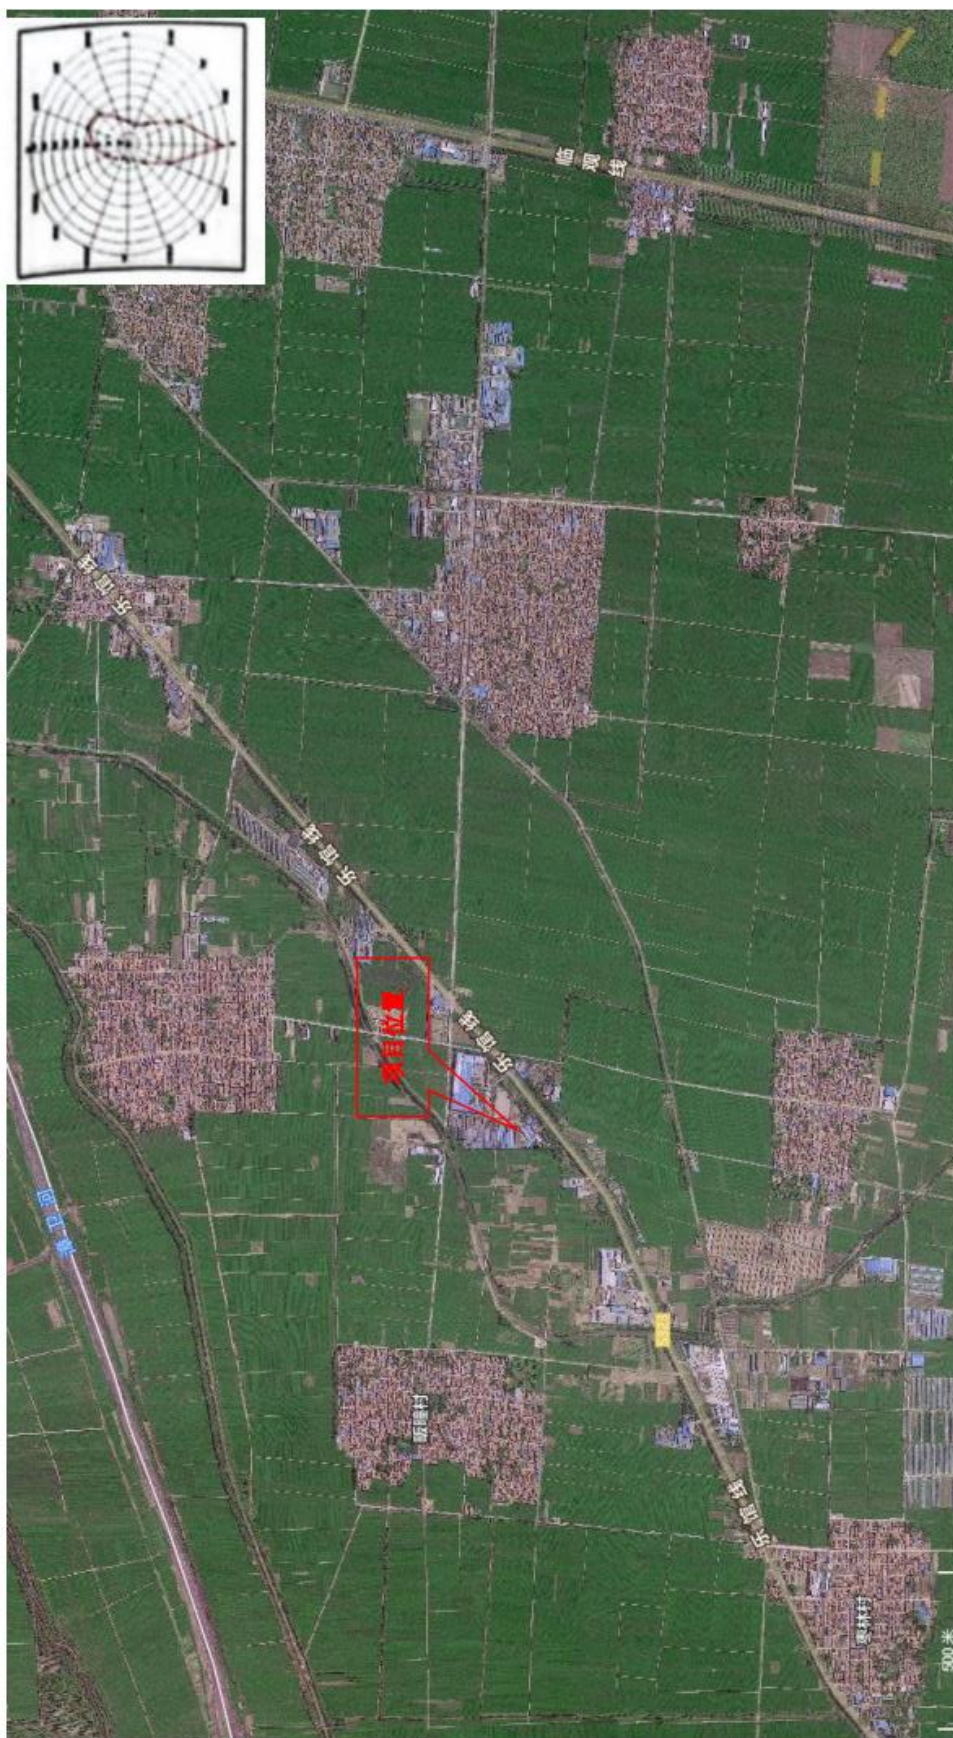

附件 2 厂区平面布置图

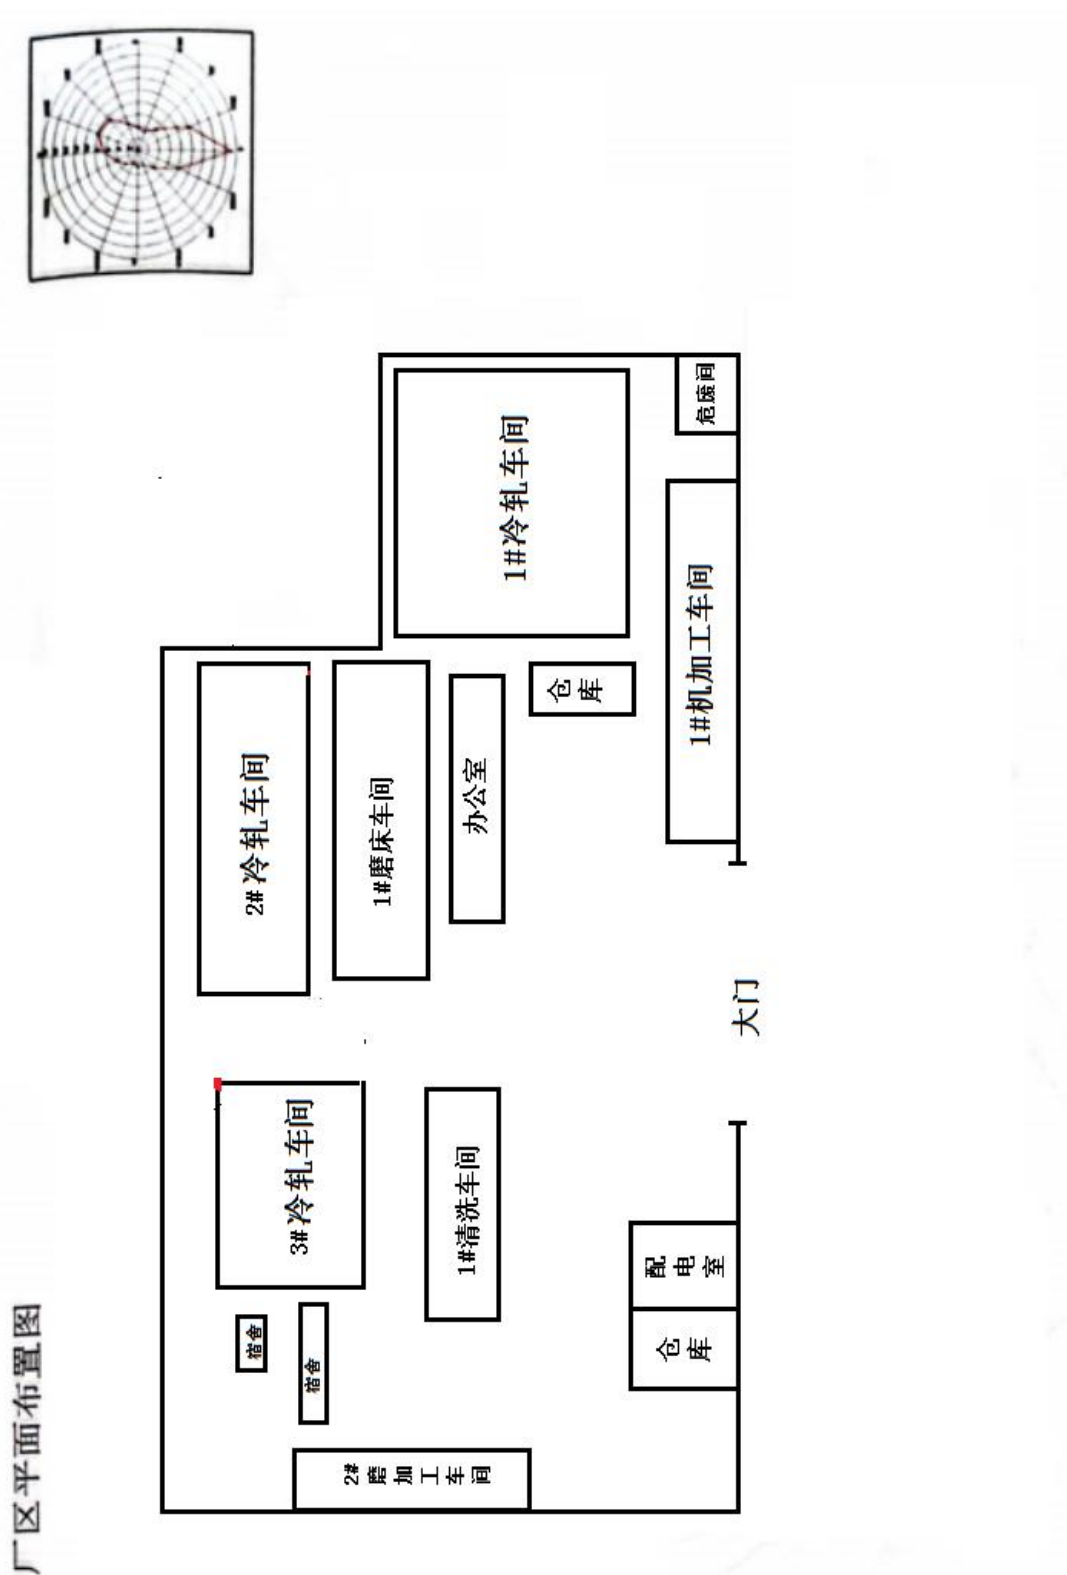

附件 3 环评结论与建议

五、环境保护措施监督检查清单

要素	内容	排放口(编号、名称)/污染源	污染物项目	环境保护措施	执行标准			
大气环境		DA004、DA005	油雾、VOCS	密闭式集气罩收集、经油雾净化器+过滤棉吸附+活性炭吸附处理后通过 15m高排气筒排放	《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB37/990-2019)；《挥发性有机物排放标准第 7 部分：其他行业》(DB37/2801.7-2019)及《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)标准			
地表水环境		无	无	/	/			
声环境		设备运转	噪声	选用低噪声设备，设备合理布置在室内，设置基础减震	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准			
电磁辐射		/	/	/	/			
固体废物	切管、车加工	金属屑、下脚料	一般固废暂存区暂存，定期外售综合利用	危废间暂存，委托具有相关资质的危险废物处置单位处理	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)			
	冷轧工序	含油废渣	危废间暂存，委托具有相关资质的危险废物处置单位处理		《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单要求			
		废轧制油						
	环保设备维护	废过滤棉				危废间暂存，委托具有相关资质的危险废物处置单位处理	《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单要求	
		废活性炭						
	机械设备维护	废润滑油						危废间暂存，委托具有相关资质的危险废物处置单位处理
废液压油								
原料使用	废包装桶	危废间暂存，委托具有相关资质的危险废物处置单位处理	《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单要求					
土壤及地下水污染防治措施	分区防渗，危废间及润滑油、液压油暂存区和冷轧区域做重点防渗，车间内其他地面做一般防渗							
生态保护措施	/							
环境风险防范措施	①在工程设计、现场管理方面做好防火防爆措施； ②定期检查废气处理设施是否正常运行，保证其对废气的处理效率； ③危废暂存间、辅料暂存间、轧制区进行重点防渗；危废间、辅料暂存区域设置围堰，保证事故状态泄露物质可得到有效截留； ④制定值班制度，对厂区实行“实时监控”； ⑤制定应急监测方案，可与有监测资质的单位签订委托监测协议； ⑥制定应急预案，成立应急小组、配备应急物资（消防器材、防护装置等），对职工定期进行风险防范及应急处置培训，定期开展应急演练。							
其他环境管理要求	无							

六、结论

从环境保护角度，本项目建设环境影响可行。

临清市行政审批服务局

临审环评[2022] 7号

关于临清市龙驰轴承有限公司年产2000万套轴承套圈 项目环境影响报告表的批复

临清市龙驰轴承有限公司：

你单位提出的《临清市龙驰轴承有限公司年产2000万套轴承套圈项目环境影响报告表》行政许可申请，经审查研究，批复如下：

一、该项目位于临清市青年街道办事处房村厂居南323省道以北临清市龙驰轴承有限公司现有厂区内，总投资500万元，其中环保投资20万元。该项目为扩建项目，依托现有生产车间，拟购置冷轧机组、切管机、车床等设备，以毛坯钢管、轧制油、液压油等为主要原辅材料，经冷轧、切管、车加工等工序生产轴承套圈，设计生产能力为年产轴承套圈2000万套。该项目已取得山东省建设项目备案证明，项目代码：2111-371581-89-01-255624。根据环境影响报告表评价结论，在全面落实报告表及审批意见提出的各项生态环境保护措施后，能够满足主体工程的需要和环境保护的要求。

二、在项目设计、建设和环境管理中，必须严格落实建设项目环境影响报告表提出的各项要求，并着重做好以下环保工作：

1、加强施工期环境管理。严格按照环评报告表要求，采取覆盖、围挡、洒水、路面硬化、绿化等有效措施，防止扬尘污染；施工废水经沉淀后循环利用，生活污水经化粪池处理后委托环卫



部门定期清运，不得外排；采取选用低噪声施工机械、合理安排施工时间、加强施工现场管理等措施，防止噪声扰民；固体废弃物须定点堆放，建筑垃圾、生活垃圾及时清运处理，不得随意倾倒。工程竣工后，施工单位应拆除各种临时施工设施，做到“工完、料尽、场地清”。

2、加强废气污染防治。1#、2#冷轧车间冷轧工序产生的废气分别经两套“密闭集气罩+油雾净化器+过滤棉吸附+活性炭吸附设施”处理后，通过2根15米高排气筒排放（1#冷轧车间废气通过现有排放口DA004排放，2#冷轧车间废气通过新建排放口DA005排放），废气中油雾排放应满足《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB37/990-2019）表1中排放浓度限值要求，VOCs排放应满足《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1中黑色金属冶炼和压延加工业Ⅱ时段排放限值要求。

应加强车间管理与通风，按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）等要求做好无组织废气控制，使厂界VOCs排放满足《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2中厂界监控点浓度限值要求及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1厂区内无组织排放限值要求。

3、加强废水污染防治。根据报告表评价结论，拟建项目无废水产生。

4、加强噪声污染防治。夜间不得生产。选用低噪声设备并

政
批
321

设置于车间内，再经过基础减振、隔声、距离衰减等降噪措施，使厂界噪声满足《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准要求。

5、加强固体废物的污染防治。含油废渣、废轧制油、废过滤棉、废活性炭、废润滑油、废液压油、废包装桶为危险废物，应委托有相应资质的单位进行处置，并按照《危险废物规范化管理指标体系》的相关要求，加强危险废物收集、贮存、转移管理，确保危险废物规范化处置；危废暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单中的要求建设。一般固体废物应严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的要求进行管理；金属屑、下脚料外售综合利用。你单位须确保所有固体废物均得到妥善处置并执行转移联单制度，对本环评未识别出的危险废物，须按危险废物管理规定进行管理，防止对环境造成二次污染。

6、加强地下水、土壤污染防治。一般固废暂存区等一般防渗区及危废暂存间、油料暂存区、冷轧区等重点区域须采取防渗、防腐、防流失及防扬散措施，防止污染土壤、地下水和大气环境。

7、加强环境风险防范。要求认真落实报告表提出的各项风险防范措施，物料暂存区设置围堰，制定环境风险应急预案，加强生产管理，严防环境风险事故发生。

8、根据报告表结论及污染物总量确认书，该项目不占用COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物，颗粒物相关总量指标。该项目VOCs排放量为0.03t/a，2倍替代量为0.06t/a。你单位需确



保污染物达标排放。

三、你单位必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。项目竣工后，须开展建设项目竣工环境保护验收，验收合格方可正式投入生产。你单位应按规定申领排污许可证，严格履行持证排污、按证排污责任。

四、积极开展清洁生产工作，严格落实“清洁生产”的相关要求。

五、加强环境监管，健全环境管理制度。按照相关规定及报告表要求设置规范的污染物排放口和固体废物堆存场，并设立标志牌。落实报告表提出的环境管理及监测计划，配备相应监测仪器或委托有资质的单位代为开展监测，建立环境监测制度。

六、环境影响评价文件自批准之日起，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或者一项以上发生重大变动且可能导致环境影响显著变化(特别是不利影响加重)的，应当重新报批环境影响评价文件。

七、你单位需认真落实各项环境污染防治措施，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。



附件 5 工况证明

验收监测期间工况情况记录表

验收项目名称	临清市龙驰轴承有限公司年产 2000 万套轴承套圈项目（一期工程）					
	2024 年 1 月 24 日			2024 年 1 月 25 日		
产品	实际负荷	设计负荷	负荷率 (%)	实际负荷	设计负荷	负荷率 (%)
冷轧钢管	9.82t/d	7.5t/d	90.93	7.04t/d	7.5t/d	93.87

建设单位盖章



附件 6 防渗证明

证明

临清市龙驰轴承有限公司年产 2000 万套轴承套圈项目(二期工程)建设的厂房内地面等所有设施在建设中都严格按照国家有关要求的相关规范设计、施工,各建设主体的防渗处理具体情况如下:

对危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)规范施工,危废暂存间的地面原土夯实后,铺设 2mm 厚高密度聚乙烯膜,防渗系数 $\leq 10^{-10}$ cm/s;聚乙烯膜上设保护层,铺设 100mm 细沙层,然后采用 150mm 厚的水泥混凝土硬化地面;生产车间地垫层,用厚 10cmC30 混凝土,地面均用防水砂浆(1:2 水泥砂浆内掺占水配重量 5%的防水剂)抹面,防渗参数 5.5×10^{-10} cm/s。

特此证明!



临清市龙驰轴承有限公司

2024 年 1 月

排污许可证

证书编号: 91371581MA3C4BB724001P

单位名称: 临清市龙驰轴承有限公司

注册地址: 临清市青年办事处房厂村315省道路北

法定代表人: 刘天庆

生产经营场所地址: 临清市青年办事处房厂村315省道路北

行业类别: 钢压延加工, 滚动轴承制造

统一社会信用代码: 91371581MA3C4BB724

有效期限: 自2023年12月15日至2028年12月14日止



发证机关: (盖章) 聊城市生态环境局临清

发证日期: 2023年12月15日

市分局

中华人民共和国生态环境部监制

聊城市生态环境局临清市分局印制

附件 8 危险废弃物处置合同

山东顺世环保科技有限公司

第 A 版 第 1 次修订

LQSS/WF-2023



扫一扫加微信

乙方合同编号:LQSS-2023-01-576

危险废弃物委托处置合同



甲 方: 临清市龙驰轴承有限公司

乙 方: 山东顺世环保科技有限公司

签 约 地 点: 山东省聊城临清市

签 约 时 间: 2023 年 12 月 31 日

危险废物委托处置合同

甲方（委托方）：临清市龙驰轴承有限公司

单位地址：临清市青年办事处房村厂

固定电话： 邮 箱：

联系人：刘天庆 手机号码：18265568999

乙方（受托方）：山东顺世环保科技有限公司

单位地址：临清市青年办事处张堂工业园

联系电话：18953920049 邮 箱：

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国环境保护法》、《山东省实施〈中华人民共和国固体废物污染环境防治法〉办法》中的法律规定及山东省《危险废物转移联单管理办法》等有关规定，甲乙双方本着“平等自愿、互助互惠”的原则，就乙方受甲方委托处理处置甲方产生的危险废物业务，为确保双方合法权益，维护正常合作，特签订本合同，以资共同信守：

第一条 合作与分工

- 1、乙方保证所持有危险废物经营许可证、营业执照等相关证件合法有效。
2. 乙方为甲方提供危险废弃物暂存技术咨询、危险废弃物分类、包装、标示规范的技术指导、危险废弃物特性等相关技术咨询。
3. 甲方负责分类收集本单位产生的危险废物，负责将各类废物分开存放，危险废物应置于规范的包装袋或包装容器内，并在包装物上张贴识别标签，废物无泄露。如因标识不清、包装破损所造成的一切后果及环境污染

染由甲方负责。

4、甲方须提前 10 个工作日联系乙方承运，乙方根据生产及物流情况确认可以运输后通知甲方，按双方确定好的收集种类及数量，甲方在固废网申领转运联单，甲方申请转运联单后，乙方负责危险废物运输、接收及无害化处置工作。甲方必须按照本合同第二条的包装要求进行包装，装车前应将待运输的废物集中摆放，并负责装车。否则乙方有权拒运，并不承担由此引起的一切责任及损失。

5. 乙方可自行运输或委托有危险废物道路运输资质的第三方负责运输。

6. 乙方收运时，工作人员进入甲方厂区应严格遵守甲方的有关规章制度及安全管理规定。

第二条 危废名称、数量及处置价格

危废名称	废物代码	形态	预处置量 (t/年)	处置价格 (元/吨)	包装规格	预计合同额(元)
废液压油	900-218-08	液态			桶装	依据化验 结果报价
废磨削液	900-006-09	液态			桶装	
废铁泥	900-006-09	袋装			袋装	
清洗废渣	900-201-08	袋装			袋装	
废活性炭	900-039-49	袋装			袋装	
超精油泥	900-200-08	袋装			袋装	
含油废渣	900-204-08	袋装			袋装	
废轧制油	900-204-08	液态			桶装	
废过滤棉	900-041-49	袋装			袋装	
废润滑油	900-217-08	液态			桶装	
废油桶	900-249-08	袋装			袋装	

以下空白						

附：须处置危险废物种类和价格需经化验确认后确定，具体价格按照双方议定的报价单为准，实际处置时，需签署附属协议。

第三条 收费及运输要求

收款账户：86612002101421006831

开户行：齐鲁银行聊城临清支行

公司名称：山东顺世环保科技有限公司

公司地址：山东省聊城市临清市青年办事处南环路西段（张堂村南）

电话：0635-2578123 18953920049

- 1、甲方向乙方缴纳合同服务款人民币 环保包 元。合同期内（包含 不含）双方协商的处置种类及相应数量，合同到期不再返还。
- 2、须处置危险废物数量、种类、合同标的总额实行据实计算并经双方签字确认。
- 3、每次运输量不足一吨按一吨结算处置费（不超两种危废），超过一吨以实际转移量结算。
- 4、甲方要求单独派车运输的，需增加单独派车费用。
- 5、运输之前甲方废物的包装必须得到乙方认可，如不符合本合同第二条包装的相关规定，乙方有权拒运。如需乙方提供包装材料，甲方需支付包装材料费用。
- 6、危险废物在甲方公司时或由于甲方包装不符合规范，导致发生意外或事故，风险和责任由甲方承担。
- 7、合同期内如需补签合同，每次需缴纳 1000 元服务费（此费用不按

处置费冲抵)。

第四条 废物的计重

废物计重按下列方式进行：

在甲方厂区内或者附近过磅称重，由甲方提供计重工具或负责相关费用。

第五条 联单的填写

甲方在厂区内称重后，在电子联单上填写重量并打印出三份联单，在相关位置盖上公章后交给乙方随车司机。货物到达乙方厂区后，乙方进行过磅复核，如出现较大磅差，乙方及时通知甲方，双方落实磅差原因后确定最终重量，乙方在固废网确认联单后，打印五份并通知甲方来盖章，甲方盖章后，乙方将其中两份联单给甲方，完成联单工作。

第六条 处置费结算

6.1 按双方协议价格，若过磅单超出协议数量，甲方装车后凭过磅单按双方协议金额补足款项。

6.2 付款方式：转账、银行电汇。乙方原则上不收取现金，特殊情况下甲方必须提出书面说明，并将现金交至乙方财务部，其他部门及人员不得收取现金，否则由此产生的一切责任由甲方承担。

第七条 合同违约责任

1. 甲乙双方任何一方违反本合同的规定，守约方有权要求违约方停止并纠正违约行为；如守约方书面通知违约方仍不改正的，守约方有权中止直至解除本合同。因此而造成的经济损失及法律责任由违约方承担。

2. 甲方所交付的危险废物不符合本合同约定的，乙方有权拒绝收运。乙

方也可就不符合本合同约定的危险废物重新提出报价单交予甲方，经双方协商同意后，再交由乙方处理。

3. 若甲方故意隐瞒乙方或收运人员，或者存在过失，造成的经济及法律责任由甲方负全责。乙方有权将该批废物返还给甲方，并要求甲方赔偿因此而造成的全部经济损失（包括分析检测费、废物处理处置费、运输费等）以及承担全部相应的法律责任。

4. 甲方逾期向乙方支付处置费、运输费的，每逾期一日按照应付总额的千分之五承担违约责任。同时，乙方随时可终止运输。并不承担由此引起的一切责任。

5. 保密义务：任何一方对于因本合同的签署和履行而知悉的对方的任何商业信息，包括但不限于处理的废物种类、名称、数量、价格及技术方案等，均不得向任何第三方透露（将商业信息提交环保行政主管部门审查的除外）。任何一方违反上述保密义务的，造成合同另一方损失的，应向另一方赔偿其因此而产生的实际损失。

第八条 合同的免责

在合同存续期内甲方或乙方因不可抗力而不能履行本合同时，应在不可抗力事件发生后7日内向对方通知不能履行或者延期履行、部分履行的理由。在取得相关证明及通知对方后，本合同可以不履行或者延期履行、部分履行，并免于相关方承担相应的违约责任。

第九条 合同争议的解决

因履行本合同产生的争议，由双方协商解决，协商不成的，由乙方所在地人民法院管辖。

第十条 合同期限

本合同有效期从 2023 年 12 月 31 日起至 2024 年 12 月 30 日止, 合同期满若甲乙双方继续合作的, 需在期满前一个月重新签订续约合同, 未签订续约合同的, 合同到期后自然终止。

第十一条 其他

1. 本合同一式贰份, 甲乙双方各持壹份。
2. 本合同经双方授权代表签名并加盖公章或业务(合同)专用章后正式生效。
3. 本合同未尽及修正事宜, 经双方协商解决或另行签约, 补充协议与本合同具有同等法律效力。

以下无正文

甲方:

授权代表:

收运联系人:

联系电话:

乙方: 山东顺世环保科技有限公司

授权代表: 宁泽勇

收运联系人: 宁泽勇

联系电话: 18806358555

签订日期: 2023 年 12 月 31 日

附件 9 污染物总量确认书

编号： LQZL（2021）125 号

临清市建设项目污染物总量确认书

（试 行）

项目名称：临清市龙驰轴承有限公司年产2000万套轴
承套圈项目

建设单位（盖章）：临清市龙驰轴承有限公司

申报时间：2021年12月22日

聊城市生态环境局临清市分局制

项目名称	临清市龙驰轴承有限公司年产 2000 万套轴承套圈项目				
建设单位	临清市龙驰轴承有限公司				
法人代表	刘天庆	联系人	刘天庆		
联系电话	18265568999	传真			
建设地点	山东省聊城市临清市青年街道办事处房村厂居南 323 省道以北临清市龙驰轴承有限公司现有厂区内				
建设性质	新建 <input type="checkbox"/> 改扩建 <input checked="" type="checkbox"/> 技改 <input type="checkbox"/>	行业类别	C3489 其他通用零部件制造		
总投资 (万元)	500	环保投资 (万元)	20	环保投 资比例	4%
计划投产日期	2022		年工作时间(d)	300	
主要 产 品	轴承套圈		产 量	2000 万套轴承套圈/ 年	
环 评 单 位	聊城市润森环保有限公司		环评评估单位		

一、主要建设内容

临清市龙驰轴承有限公司年产 2000 万套轴承套圈项目，总投资 500 万元，位于山东省聊城市临清市青年街道办事处房村厂居南 323 省道以北临清市龙驰轴承有限公司现有厂区内。

主要建设内容如下：（一）主体工程：项目建设 3 个生产车间，1#冷轧车间，占地面积 500m²，安装冷轧机组；1#冷轧车间，占地面积 1100m²，安装冷轧机组；机加工车间，占地面积 800m²，安装切管机、车床。（二）辅助工程：设置办公室，建筑面积 100m²，用于职工办公。（三）储运工程：设置物料存储区，位于冷轧车间内部，用于原料、产品等物料暂存。（四）公用工程：项目无新增用水；项目用电由供电所供给。（五）环保工程：一是废气治理：1#冷轧车间废气经油雾净化器+过滤棉+活性炭吸附装置(TA001)处理后通过 15m 高排气筒 (DA004) 排放；2#冷轧车间废气经油雾净化器+过滤棉+活性炭吸附装置 (TA002) 处理后通过 15m 高排气筒 (DA005) 排放；。二是固废治理：设置危废暂存间一座，占地面积 30m²，用于含油废渣、废润滑油等危废的暂存。三是噪声治理：通过设备合理布局、基础减震、厂房隔音、距离衰减降低噪声值。

二、水及能源消耗情况			
名称	消耗量	名称	消耗量
水 (吨/年)		电 (万千瓦时/年)	
燃煤 (吨/年)		燃煤硫分 (%)	
燃油 (吨/年)		天然气 (万立方米/年)	

三、主要污染物排放情况

污染要素	污染因子	排放浓度	年排放量 (吨/年)	排放去向
废水	1.COD	-	-	项目无生产及生活用水, 同时无生产废水和生活污水的产生和排放
	2.NH ₃ -N	-	-	
废气	1.VOCs	-	0.03	项目运营期废气主要为轧制区因金属变形产生的热量导致轧制油挥发产生的 VOCs (NMHC), 冷轧废气 (VOCs) 拟采取整体密闭集气罩收集、油雾净化器+过滤棉吸附+活性炭吸附的措施进行处理, 最终通过 15m 高排气筒排放
固废	1.一般固废	-	-	项目危险废物主要为含油废渣、废轧制油、废活性炭、废润滑油、废过滤棉、废油桶, 委托有相应处置资质单位处置。金属屑和下脚料暂存于一般固废暂存区, 定期外售综合利用
	2.危险废物	-	-	

备注:

四、总量指标调剂及“以新带老”情况

根据《建设项目环境影响报告表》, 临清市龙驰轴承有限公司年产 2000 万套轴承套圈项目, 需申请的总量指标为 VOCs、0.03t/a, 2 倍替代量为 VOCs0.06t/a。所需 VOCs 总量指标来源于临清市卓凡轴承有限公司年产 30 万套圆锥轴承及 500 吨毛坯滚子项目拆除工程的减排量, 能够满足本项目所需, 符合 2 倍替代要求。

五、政府拨付“十四五”污染物总量指标（吨/年）

化学需氧量	氨氮	二氧化硫	氮氧化物	VOCs	颗粒物
0	0	0	0	0.03	0

六、建设项目环境影响评价预测污染物排放总量（吨/年）

化学需氧量	氨氮	二氧化硫	氮氧化物	VOCs	颗粒物
0	0	0	0	0.03	0

七、县级环保局总量指标（吨/年）

化学需氧量	氨氮	二氧化硫	氮氧化物	VOCs	颗粒物
0	0	0	0	0.03	0

市生态环境局分局审核意见：

临清市龙驰轴承有限公司年产 2000 万套轴承套圈项目。项目无生产及生活用水，同时无生产废水和生活污水的产生和排放

项目生产过程产生的废气主要为冷轧工序，轧制区因金属变形产生的热量导致轧制油挥发产生的 VOCs（NMHC），冷轧废气（油雾+VOCs）拟采取整体密闭集气罩收集。1#冷轧车间收集后的废气经油雾净化器+过滤棉+活性炭吸附装置（TA001）处理，处理后达标的通过 15m 高排气筒（DA004）排放；2#冷轧车间收集后的废气经油雾净化器+过滤棉+活性炭吸附装置（TA002）处理，处理后达标的后通过 15m 高排气筒（DA005）排放；冷轧工序主要使用轧制油，轧制油的使用量为 5.4t/a，VOCs 的产生量为 0.106t/a，VOCs 排放量为 0.03t/a（有组织 0.019t/a、无组织 0.011t/a）。申请大气主要污染物总量指标为 VOCs0.03t/a（其中有组织 0.019t/a、无组织 0.011t/a）。

临清市龙驰轴承有限公司年产 2000 万套轴承套圈项目，需申请的总量指标为 VOCs0.03t/a。所需 VOCs 总量指标来源于临清市卓凡轴承有限公司年产 30 万套圆锥轴承及 500 吨毛坯滚子项目拆除工程的减排量。项目申请大气主要污染物总量指标执行“2 倍替代”要求，2 倍替代量为 VOCs0.06t/a。替代源及替代量能够满足项目建设所需，符合《山东省生态环境厅关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理的通知》（鲁环发【2019】132 号）文件中“2 倍替代”要求。

同意污染物总量确认。



有关说明

1. 为落实国家和省关于加强宏观调控和总量减排的部署要求,根据省环保厅《关于进一步落实好环评和“三同时”制度的意见》(鲁环发〔2007〕131号文件)要求,市生态环境局特制定本《总量确认书》,主要适用于市县两级环保部门审批的建设项目,作为环评审批的前置条件。

2. 建设单位需认真填写建设项目总量指标等相关内容,经县级生态环境局总量管理部门审查同意后,将确认书一式四份连同有关证明材料报市生态环境局。市生态环境局收到申报材料后,视情况决定是否需要现场核查。对证明材料齐全、符合总量管理要求的,自受理之日起20个工作日内予以总量指标确认。

3. “总量指标调剂及‘以新带老’情况”的填写内容必须包括:(1)二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮等主要污染物总量指标来源及数量;(2)替代项目削减总量的工程措施、主要工艺、削减能力及完成时限;(3)相关企业纳入《“十四五”主要污染物总量削减目标责任书》及国家、省、市污染治理计划的工程项目完成情况等。

4. 对市、县(市、区)政府未下达“十四五”期间污染物总量指标的,确认书中的相关总量指标栏目可不填写。

5. 确认书编号由市生态环境局临清市分局总量管理部门统一填写,前4位字母为分局机构简称,中间4位为年度,后3位为顺序号。

6. 确认书一式四份,建设单位、县级总量管理部门、市级总量管理部门、项目环评审批负责部门各1份。

7. 如确认书所提供的空白页不够,可增加附页。

附件 10 应急预案备案表

企业事业单位突发环境事件应急预案备案表

单位名称	临清市龙驰轴承有限公司	统一社会信用代码	91371581MA3C4BB724
法定代表人	刘天庆	联系电话	18265568999
联系人	刘天峰	联系电话	13863570097
传真		电子邮箱	
地址	山东省聊城市临清市青年办事处房厂村 315 省道路北 中心经纬度：东经 115° 36' 46.84" 北纬 36° 46' 30"		
预案名称	临清市龙驰轴承有限公司 突发环境事件应急预案		
风险级别	一般【一般-大气 (Q ₁) +一般-水 (Q ₂)】		
<p>本单位于 2022 年 1 月 18 日签署发布了突发环境事件应急预案，备案条件具备，备案文件齐全，现报送备案。</p> <p>本单位承诺，本单位在办理备案中所提供的相关文件及其信息均经本单位确认真实，无造假，且未隐瞒事实。</p>			
 <p>临清市龙驰轴承有限公司</p>			
预案签署人	刘天庆	报送时间	2022 年 1 月 19 日

<p>突发环境事件应急预案备案文件目录</p>	<p>1. 突发环境事件应急预案备案表； 2. 环境应急预案及编制说明： 环境应急预案（签署发布文件、环境应急预案文本）； 编制说明（编制过程概述、重点内容说明、征求意见及采纳情况说明、评审情况说明）； 3. 环境风险评估报告； 4. 环境应急资源调查报告； 5. 环境应急预案评审意见。</p>		
<p>备案意见</p>	<p>该单位的突发环境事件应急预案备案文件已于2022年1月19日收讫，文件齐全，予以备案。</p> <p style="text-align: right;">聊城市生态环境局临清市分局 2022年1月19日</p>		
<p>备案编号</p>	<p>371581-2022-022-L</p>		
<p>报送单位</p>	<p>临清市龙驰轴承有限公司</p>		
<p>受理部门负责人</p>	<p>侯佩卓</p>	<p>经办人</p>	<p>张连星</p>

附件 11 夜间不生产证明

夜间不生产证明

我公司年产 2000 万套轴承套圈项目（二期工程）在生产过程中严格遵守环评中的工作制度，实行常白班制，每天工作时间 8 小时，夜间不进行生产作业。

特此承诺！



临清市龙驰轴承有限公司

附件 12 一期工程验收意见

临清市龙驰轴承有限公司年产 2000 万套轴承套圈项目（一期）竣工环境保护验收组意见

2022 年 6 月 20 日，临清市龙驰轴承有限公司组织了“临清市龙驰轴承有限公司年产 2000 万套轴承套圈项目（一期）”竣工环境保护验收现场会。参加现场检查的有竣工环境保护验收监测单位-山东恒辉环保科技有限公司和特邀的 2 名专家。验收会成立了项目竣工环境保护验收组（名单附后），听取了建设单位关于项目环保执行情况的介绍和关于项目竣工环境保护验收监测报告等情况的汇报，现场检查了项目及环保设施的建设、运行情况，审阅并核实了有关资料。根据《临清市龙驰轴承有限公司年产 2000 万套轴承套圈项目（一期）环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批意见等要求对本项目进行验收，经认真讨论，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目为临清市龙驰轴承有限公司年产 2000 万套轴承套圈项目（一期），位于山东省聊城市临清市青年街道办事处房村厂居南 323 省道以北，占地面积为 10000m²，项目租赁村委会土地进行建设，本项目投资 300 万元，其中环保投资 15 万元，占投资额的 5%。项目建设冷轧机组等生产设备 7 台（套），本项目一期具备年产 1200 万套轴承套圈的能力。

（二）建设过程及环保审批情况

本项目临清市龙驰轴承有限公司年产 2000 万套轴承套圈项目（一期）为扩建项目，临清市龙驰轴承有限公司于 2022 年 1 月委托聊城市润森环保有限公司编制完成了《临清市龙驰轴承有限公司年产 2000 万套轴承套圈项目环境影响报告表》，2022 年 1 月 11 日临清市行政审批服务局以临审环评【2022】7 号对其进行了审批。建设单位进行分期建设，一期建设项目建设冷轧机组等生产设备 7 台（套），本项目一期具备年产 1200 万套轴承套圈的能力。

（三）投资情况

根据验收报告，项目实际投资 300 万元，环保投资 15 万元，占投资额的 5%。

活性炭、废润滑油、废液压油、废包装桶。含油废渣、废轧制油、废润滑油、废液压油、废过滤棉和废活性炭属于危险废物，由建设单位按照规定收集暂存后，委托临清市顺世环保科技有限公司转运处置；项目废包装桶包括废轧制油桶、废润滑油桶、废液压油桶。废包装桶属于危险废物，委托临清市顺世环保科技有限公司转运处置。

（五）其他环境保护设施

1.在线监测装置

按照现行要求，企业不需要设置在线监测装置。

2.环境管理调查

公司制定了详细的环境管理制度，公司设置专职环境管理人员，负责全厂的环境管理工作。

四、环境保护设施调试效果

1、废气

有组织废气：验收监测期间，1#冷轧车间废气排气筒 DA004 出口非甲烷总烃浓度在 1.83 -2.24 mg/m³之间，最大排放速率为 2.05×10⁻³kg/h。油雾最大排放浓度为 0.4 mg/m³。2#冷轧车间废气排气筒 DA005 出口非甲烷总烃浓度在 1.80 -2.15 mg/m³之间，最大排放速率为 1.90×10⁻³kg/h。油雾最大排放浓度为 0.3 mg/m³。满足废气 VOCs 排放执行《挥发性有机物排放标准第 7 部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表 1 黑色金属冶炼和压延加工业 II 时段标准值浓度≤20 mg/m³、速率≤3.0 kg/h，油雾排放执行《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB37/990-2019）表 1 轧制机组对应的浓度限值≤20mg/m³。无组织废气非甲烷总烃小时浓度最高为 0.57mg/m³，满足《挥发性有机物排放标准第 4 部分：印刷业》（DB37/2801.4-2017）表 3 厂界无组织监控点挥发性有机物浓度限值要求（2.0mg/m³）。

经验收监测结果计算，本项目能满足总量排放的要求，VOCs 排放量为 0.0083t/a，满足《临清市龙驰轴承有限公司年产 2000 万套轴承套圈项目污染物总量确认书》（LQZL（2021）125 号）中确认的总量为 VOCs：0.03t/a。

无组织废气：验收监测期间，01#、02#、03#、04#无组织非甲烷总烃小时浓度在 0.72-1.03mg/m³，满足《挥发性有机物排放标准 第 7 部分：其他行业》

(DB37/2801.7-2019)表2厂界监控点VOCs浓度限值要求: $\leq 2.0 \text{ mg/m}^3$ 以及《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表A.1中厂区内VOCs无组织特别排放限值要求: 6 mg/m^3 。

2、废水

本项目无生产废水产生。

3、噪声

验收监测期间,1#、2#、3#、4#监测点位昼间噪声在49.2dB(A)-57.8dB(A)之间,夜间不生产,昼间满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准限值要求(昼间60dB)。

4、固体废物

项目产生的固体废物全部得到有效处置。

五、项目建设对环境的影响

项目竣工环境保护验收报告和现场检查表明,项目污染物排放量较少,对周围环境影响较小。

六、验收结论

企业建设了环保设施,落实了环境保护部门批复要求。验收报告中的监测数据表明,各项污染物能够达标排放。该项目基本符合自主验收条件。

七、后续要求

1、根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》进一步完善验收报告的编制。

2、加强废气治理设施的管理和运行,确保废气达标排放,完善各种环保标识。

3、完善环境管理制度,加强环境风险管理,完善风险防范措施。

4、加强生产设备环境污染防治工作,定期维护设备,降低环境污染,确保各污染物排放控制在最低限值。

5、进一步完善各种环保规章制度,保证环保设施正常运转,将环境管理纳入到生产管理全过程中去。

八、验收人员信息

见附件。

临清市龙驰轴承有限公司（签章）

2022年06月20日

临清市龙驰轴承有限公司年产 2000 万套轴承套圈项目（一期）

竣工环境保护验收人员名单

验收组成员	单位、职务	签名	备注
组长	临清市龙驰轴承有限公司总经理		建设单位
成员	山东恒辉环保科技有限公司	刘海迪	验收监测单位
	山东城市建设职业学院 董超 副教授	马起	专家
	山东求卓环保科技有限公司 谭学界 高级工程师	谭学界	专家



181512342018



检测 报 告

Testing Report

山东恒辉检字 (YS) 第 202401-L150 号


项目名称: 年产 2000 万套轴承套圈项目 (一期)

委托单位: 临清市龙驰轴承有限公司

报告日期: 2024 年 01 月 30 日

山东恒辉环保科技有限公司

Shandong Heng Hui Environmental Protection Technology Co.,Ltd





检测报告说明

- 1、检测报告无本公司检测专用章、无 CMA 专用章、无骑缝章无效。
- 2、检测报告无检测（或编制）、审核、批准人签字无效。
- 3、本检测报告涂改、增删无效。
- 4、委托送样检测仪对来样检测结果负责。
- 5、检测结果仅对本次样品有效。
- 6、未经本公司同意，不得用于各类广告宣传。
- 7、如对检测报告有异议者，请于收到报告之日起十五日内向本公司提出复检申请，逾期不予受理。
- 8、未经本公司批准，本检测报告不得复印（全文复印除外）。

公司名称：山东恒辉环保科技有限公司

检测地址：山东省淄博市高新区四宝山街道办事处彩虹路与鼎宏路北首山东邮电工程公司淄博分公司（二楼）

联系电话：0533-2398198 18953351966

邮 编：255000



山东恒辉环保科技有限公司

检测报告

山东恒辉检字 (YS) 第 202401-L150 号

第 1 页 共 5 页

委托单位	临清市龙驰轴承有限公司				
联系人	刘天庆	联系电话	18265568999		
采(送)样日期	2024年01月24日-25日	分析日期	2024年01月25日-27日		
样品类型	有组织废气、无组织废气、噪声				
样品状态	样品容器密封完好、无破损, 样品无污染、无泄漏				
质量控制及质量保证	本次检测依据国家标准, 检测人员均持证上岗, 所用仪器均在有效检定周期内。				
检测依据					
序号	检测项目	标准名称及依据	仪器名称及型号	仪器编号	检出限
1	噪声	GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准	AWA6228+ 多功能声级计	HHYQ-355-2022	/
2	总悬浮颗粒物	HJ1263-2022 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法	AUW120D 十万分之一电子天平	HHYQ-022-2018	168 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
			DRK 250 恒温恒湿箱	HHYQ-043-2018	
3	VOCs	HJ 604-2017 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法	GC-7960plus 气相色谱仪	HHYQ-297-2021	0.07 mg/m^3
4	VOCs	HJ 38-2017 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法	GC-7960plus 气相色谱仪	HHYQ-297-2021	0.07 mg/m^3
5	油雾	HJ 1077-2019 固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法	JC-01L-8 红外分光测油仪	HHYQ-090-2019	/
备注	本次检测结果不予判定。				
编制人:	[Signature]		审核人:	[Signature]	
			授权签字人:	[Signature]	
			检测专用章:	[Red Seal]	
			批准日期:	2024年01月30日	



检测报告

一、有组织废气检测结果:

表 1-1 冷轧排气筒进口检测结果

检测点位	冷轧排气筒进口					
采样日期	2024年01月24日			2024年01月25日		
检测频次	第一次	第二次	第三次	第一次	第二次	第三次
内径/高度(m)	0.20/-					
烟温(℃)	5.0	4.7	5.1	6.3	6.2	6.0
标干流量(m ³ /h)	2546	2418	2516	2210	2276	2238
样品编号	202401-L150FQ0004-0006			202401-L150FQ0010-0012		
油雾排放浓度(mg/m ³)	7.8	7.5	6.6	8.0	8.4	7.2
油雾排放速率(kg/h)	1.99×10 ⁻²	1.81×10 ⁻²	1.66×10 ⁻²	1.77×10 ⁻²	1.91×10 ⁻²	1.61×10 ⁻²
样品编号	202401-L150FQ0019-0021			202401-L150FQ0040-0042		
VOCs排放浓度(mg/m ³)	19.6	15.0	18.0	19.0	20.0	18.6
VOCs排放速率(kg/h)	4.17×10 ⁻²	3.72×10 ⁻²	4.60×10 ⁻²	4.20×10 ⁻²	4.55×10 ⁻²	4.16×10 ⁻²
备注						

表 1-2 冷轧排气筒出口检测结果

检测点位	冷轧排气筒出口					
采样日期	2024年01月24日			2024年01月25日		
检测频次	第一次	第二次	第三次	第一次	第二次	第三次
内径/高度(m)	0.20/15					
烟温(℃)	6.6	6.7	6.5	7.1	7.2	7.7
标干流量(m ³ /h)	2125	2478	2454	1998	2140	2322
样品编号	202401-L150FQ0001-0003			202401-L150FQ0007-0009		



山东恒辉环保科技有限公司

检测报告

山东恒辉检字 (YS) 第 202401-L150 号

第 3 页 共 5 页

油雾排放浓度 (mg/m ³)	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5
油雾排放速率 (kg/h)	1.06×10 ⁻³	1.24×10 ⁻³	9.82×10 ⁻⁴	9.99×10 ⁻⁴	8.56×10 ⁻⁴	1.16×10 ⁻³
样品编号	202401-L150FQ0016-0018			202401-L150FQ0037-0039		
VOCs 排放浓度 (mg/m ³)	3.56	3.21	4.07	4.26	3.63	3.65
VOCs 排放速率 (kg/h)	9.06×10 ⁻³	7.76×10 ⁻³	1.02×10 ⁻²	8.51×10 ⁻³	7.77×10 ⁻³	8.48×10 ⁻³
备注						

二、无组织废气检测结果:

表 2-1 颗粒物检测结果

采样日期		颗粒物 (μg/m ³)			
		01#上风向	02#下风向	03#下风向	04#下风向
2024 年 01 月 24 日	样品编号	202401-L150FQ0001-0012			
	第一次	221	263	273	276
	第二次	228	279	292	287
	第三次	231	296	302	286
2024 年 01 月 25 日	样品编号	202401-L150FQ0013-0024			
	第一次	231	273	279	284
	第二次	218	254	270	278
	第三次	236	268	281	287
备注					

表 2-2 VOCs 检测结果

采样日期		VOCs (mg/m ³)				
		01#上风向	02#下风向	03#下风向	04#下风向	厂区内 5#
2024 年 01	样品编号	202401-L150FQ0001-0015				



检测报告

山东恒辉检字 (YS) 第 202401-L150 号

第 4 页 共 5 页

月 24 日	第一次	0.74	0.91	0.99	0.87	1.22
	第二次	0.77	1.00	0.98	0.88	1.16
	第三次	0.73	0.89	0.92	0.89	1.18
2024 年 01 月 25 日	样品编号	202401-L150FQ0022-0036				
	第一次	0.70	0.94	0.81	0.86	1.13
	第二次	0.67	0.95	0.83	0.81	1.13
	第三次	0.73	0.93	0.88	0.91	1.15
备注						

表 2-3 采样气象观测数据

采样日期	时间	温度 (°C)	相对湿度 (%)	风向	风速 (m/s)	总云量	低云量	气压 (KPa)
2024 年 01 月 24 日	09:36	-2.2	50	S	1.37	1	0	103.87
	10:50	2.5	47	S	1.32	1	0	103.62
	11:55	2.9	47	S	1.30	1	0	103.58
2024 年 01 月 25 日	12:41	4.3	46	SE	1.29	1	0	103.32
	13:51	5.7	46	SE	1.28	1	0	103.30
	15:00	6.0	46	SE	1.27	1	0	102.28
备注								

三、噪声检测结果:

表 3-1 噪声检测结果

采样日期	采样点位	测量时段	检测结果 Leq dB (A)	气象条件
2024 年 01 月 24 日	10:01	05#东厂界外 1m 处	昼间	54.9
	10:14	06#南厂界外 1m 处	昼间	56.8
	10:27	07#西厂界外 1m 处	昼间	56.9
				无雷电, 无雨雪, 风速 1.36m/s



山东恒辉环保科技有限公司


检测报告

山东恒辉检字 (YS) 第 202401-L150 号

第 5 页 共 5 页

2024年01 月25日	10:38	08#北厂界外1m处	昼间	58.1	无雷电, 无雨雪, 风速 1.28m/s
	13:03	05#东厂界外1m处	昼间	55.9	
	13:15	06#南厂界外1m处	昼间	57.7	
	13:28	07#西厂界外1m处	昼间	58.1	
	13:41	08#北厂界外1m处	昼间	52.5	
备注					

附件：点位示意图

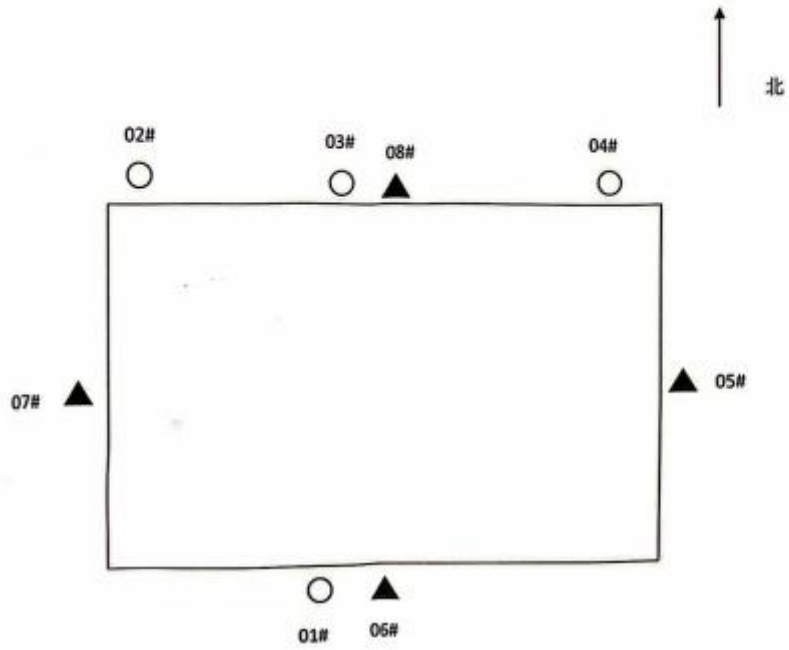


图例：

○ 无组织采样点

▲ 噪声检测点

2024年01月24日检测点位示意图

附件：点位示意图

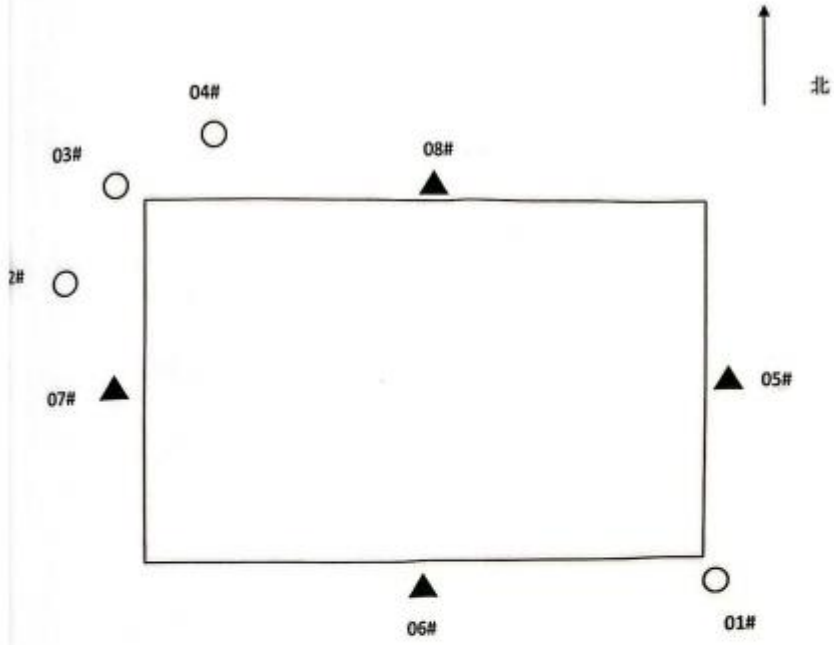

图例：

- 无组织采样点
- ▲ 噪声检测点

2024年01月25日检测点位示意图

.....本报告结束.....
